



ADENDUM #3

A las compañías que retiraron las Bases de Licitación Pública Nacional **LPN-MPC-GT-15-2023 "PAVIMENTACIÓN DE 3 Y 4 AVENIDA 9-12 CALLE DONDE PASA EL EQUIPO PESADO, SAN RAMÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS"**, se les hace de conocimiento lo siguiente:


1. Bajo que concepto se pagaran el botado de todos los desperdicios de la excavación común?
R/= EL departamento de Mantenimiento vial dispondrá de todo el desperdicio producto de la excavación.

2. ¿Existe algún botadero autorizado donde depositar los desperdicios de la excavación común?
R/= EL departamento de Mantenimiento vial dispondrá de todo el desperdicio producto de la excavación.

3. ¿La actividad 2.03 Relleno y compactado con material selecto, esta actividad es para rellenar el espacio que queda entre la pared de la cuneta y excavación?
R/= Es correcto su entender.

4. ¿Se deberá incluir primer para la aplicación de la pintura? Y bajo que concepto será cobrado
R/= Si incluye. El cobro se realizará dentro de la misma actividad de la pintura.

5. Favor proporcionar el detalle de donde se colocará el geotextil y proporcionar las especificaciones técnicas del mismo (si es o no tejido y otras características).
R/=

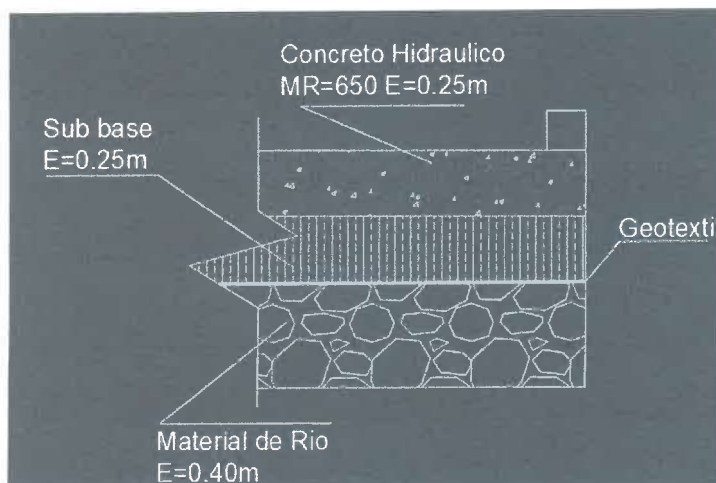


P.



Geotextil tejido, para mejorar la estabilización del suelo, separación y el refuerzo de la capa base a través de la gestión continua de la humedad. Deberá tener características hidrófilas y Hilos higroscópicos absorbentes que proporcionen un mayor drenaje a lo largo del plano del geotextil

6. Favor indicar cual será la longitud de la varilla #4 que se colocará en la junta longitudinal de la línea central ya que solo dan la separación

R/= La longitud será de 1.20m

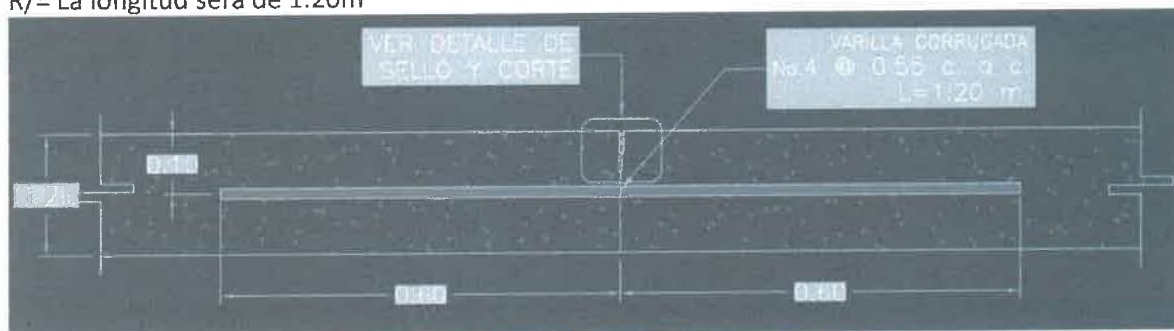

7. En la hoja #3 de los planos aparece un detalle de juntas sin sello favor indicar o aclarar donde se ubicarán dicha junta

R/= Todas las juntas deberán de ser selladas.

8. Favor aclarar si todas las juntas transversales habrá que colocarles dovelas según detalle proporcionado.

R/= Todas las juntas transversales se les colocara dovela a excepción de la junta de construcción al finalizar la jornada donde el refuerzo se coloca en el encofrado.


9. Favor indicar si la vialetas (ojo de gato) son doble cara.

R/= Si serán de doble cara

P.



10. Favor proporcionar el detalle de bordillo intermitente en donde se indiquen las dimensiones.
R/=

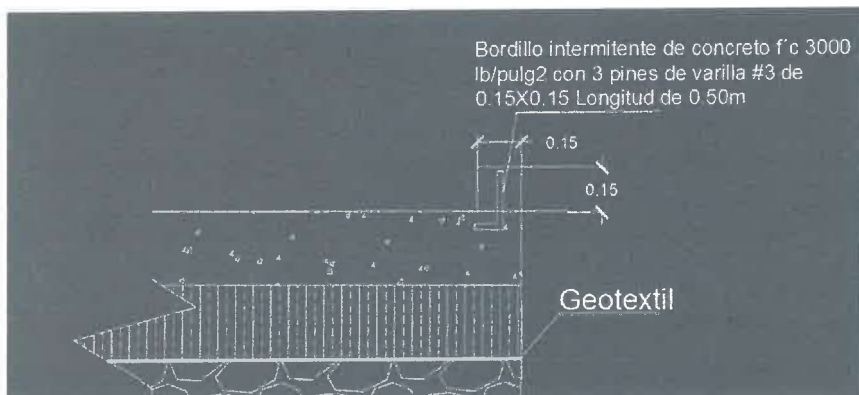


Ing. Dunia Zuniga
Gerente Técnico

