Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**'ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE IMPULSION Y RED DE AGUA POTABLE**	**79 días**	**lun 19/08/24**	**mié 13/11/24**
2		**Preliminares**	**4 días**	**lun 19/08/24**	**jue 22/08/24**
3		Movilización y desmovilización de equipo y maquinaria	2 días	mié 21/08/24	jue 22/08/24
4		Elaboración e instalación de rotulo de proyecto en sitio.	2 días	lun 19/08/24	mar 20/08/24
5		**Movimiento de Tierra**	**24 días**	**lun 19/08/24**	**vie 13/09/24**
6		Corte de suelo para dejar calle a nivel de subrasante incluye descapote y destronque	5 días	jue 22/08/24	mié 28/08/24
7		Excavación General incluye: zanjas para instalación de tubería de alcantarillado sanitario central, alcantarillado sanitario domiciliar, línea de impulsión, manholes y cimentaciones	15 días	mié 28/08/24	vie 13/09/24
8		Suministro y colocación de base con material selecto, con compactación al 95% de proctor modificado, previo a la colocación de la cama de arena	5 días	lun 19/08/24	vie 23/08/24
9		Colocación de cama de arena para soporte de tubería de PVC y Novafort de alcantarillado y potable	8 días	vie 23/08/24	lun 02/09/24
10		Relleno de material selecto compactado (manual), al 95% de proctor modificado, sobre zona sobre excavada	8 días	lun 19/08/24	mar 27/08/24
11		**Línea Central de Alcantarillado Sanitario y Pozos de Inspección**	**41 días**	**mar 27/08/24**	**vie 11/10/24**
12		Suministro e instalación de Tubería Novafort de 24" y sus accesorios	6 días	lun 02/09/24	lun 09/09/24
13		Construcción de manholes con ladrillo rafon según detalle en planos	25 días	vie 13/09/24	vie 11/10/24
14		Suministro e instalaciones tapadera de control en manholes de inspección	3 días	mar 27/08/24	vie 30/08/24
15		Prueba Hidrostática	9 días	mar 10/09/24	vie 20/09/24
16		**Acometida para sistema de Alcantarillado Sanitario Domiciliar**	**60 días**	**lun 09/09/24**	**mié 13/11/24**
17		Suministro e instalación de tubería de 6" de PVC, en zonas donde necesite cambio	7 días	jue 12/09/24	vie 20/09/24
18		Construcción de cajas de registro domiciliares, según sea necesario	15 días	vie 11/10/24	lun 28/10/24
19		Cajas de Registro colectoras domiciliares (principal para conexión a colector de línea central)	15 días	lun 28/10/24	mié 13/11/24
20		Suministro e Instalación de tubería de 12" Novafort para conexión de caja de registro domiciliar hacia colector de línea central	4 días	lun 09/09/24	jue 12/09/24
21		Prueba Hidrostática	6 días	lun 23/09/24	sáb 28/09/24

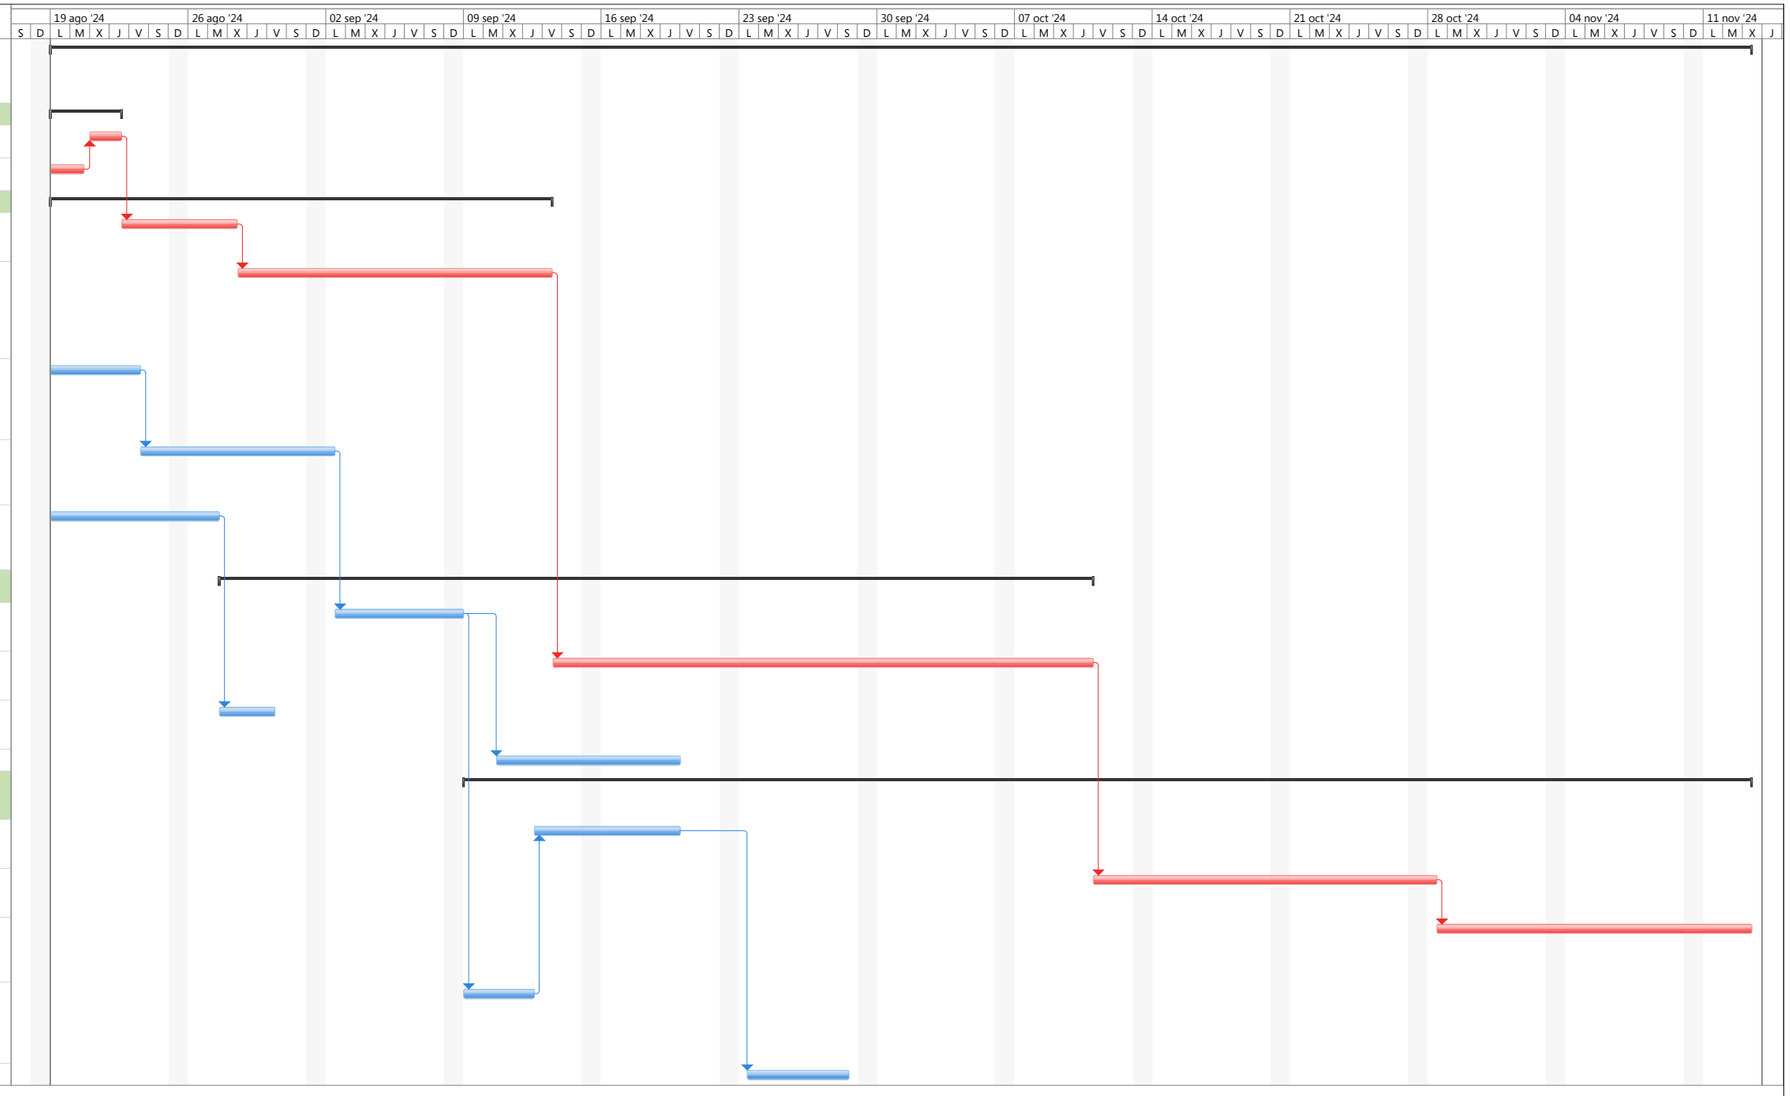

Proyecto: Cronograma
Fecha: mié 25/06/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual
