

**Términos de Referencia**  
**Proceso para Contratación**  
**Lote N° 3**

**Consultoría individual para la Supervisión de los Proyectos: 1) Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de río Ulúa sector Colonia la Democracia; 2) Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha y mejoramiento hidráulico de quebrada los castaños, sector Colonia Nacional; 3) Cierre provisional de tramos de bordo margen derecha del río Ulúa sectores Campo Buena Vista y Campo las Flores.**

**I. ANTECEDENTES:**

El valle de Sula por su amplia extensión superficial de 2,400 KM<sup>2</sup>, es una zona altamente vulnerable ante los altos niveles de precipitación durante los periodos lluviosos de invierno y los excesivos caudales que se generan en los ríos Ulúa y Chamelecón, los cuales impactan en toda la planicie del Valle de Sula, produciendo terribles daños a la infraestructura pública y privada y a los bienes y vidas de sus pobladores. Esta época del año se considera como un periodo cíclico de eventos climatológicos de alta magnitud, siendo el caso particular la presencia de las Depresiones Tropicales ETA e IOTA, durante el periodo del 01 al 05 de noviembre y del 17 al 20 de noviembre del presente año respectivamente, generando precipitaciones entre 850 y 1,200 mm de lluvia acumulados. Estas precipitaciones generaron caudales por arriba de los 4,700 m<sup>3</sup>/seg que es lo registrado para el evento del Huracán Mitch a la altura de la Estación Telemétrica El Tablón en la cuenca del río Chamelecón, sumado a estos caudales en las subcuencas aguas abajo de dicha estación, activando los canales de alivio Maya y Chotepe, dichos caudales superan los periodos de diseño de tales obras hidráulicas impactando el área de la cuenca baja de los municipios que conforman el Valle de Sula, tales como San Pedro Sula, Villanueva, La Lima, San Manuel, Choloma y Puerto Cortés. Así mismo en la cuenca del Río Ulúa, se registraron niveles en la estación de Santiago superiores a los 8.00 mts y en la estación de Chinda superiores a los 15.00 mts, registrando caudales por arriba de 11,000 m<sup>3</sup>/seg, que es lo registrado para el evento del Huracán Mitch, sumado a estos caudales lo aportado por las cuencas de los ríos Cuyamapa y Humuya,



activando los canales de alivio del río Ulúa que se interconectan con el río Chamelecón y los ríos Guaymón y Guaymitas, dichos caudales superan la capacidad hidráulica del sistema, impactando en los municipios que conforman el Valle de Sula, tales como Santa Cruz de Yojoa, Santa Rita, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, El Progreso, El Negrito, Puerto Cortés y Tela; sumado el aporte de todas las vertientes de la Cuenca de mico Quemado desde Quebrada Seca hasta el Río Guaymón; cuyos impactos se han reflejado en daños a la infraestructura de protección contra inundaciones; razón por la cual el Gobierno de la Republica Decreto Estado de Emergencia mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 02 de noviembre de 2020.

La *Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula*, por la naturaleza de los servicios que brinda, en consideración a lo anteriormente descrito, requiere de la contratación de los servicios profesionales de un **Consultor individual** para la supervisión de los proyectos:

- 1) **Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de río Ulúa sector Colonia la Democracia.**
- 2) **Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha y mejoramiento hidráulico de quebrada los castaños, sector Colonia Nacional.**
- 3) **Cierre provisional de tramos de bordo margen derecha del río Ulúa sectores Campo Buena Vista y Campo las Flores.**

Se adjudicará un contrato por cada proyecto.

## II. GENERALIDADES:

**Contratante:** *Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula (CCIVS)*

**Fuente de financiamiento:** Para el financiamiento de estos Servicios Profesionales, se utilizaran fondos nacionales asignados a la **Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula**, según Cuenta de la Tesorería General de la República. Estos pagos serán hechos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).



**Nombre y ubicación de los proyectos:**

- 1) **Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de río Ulúa sector Colonia la Democracia.**

**Ubicación:** Jurisdicción de San Manuel, departamento de Cortés.

**Coordenadas** 411849.00 m E; 1703183.00 m N.

- 2) **Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha y mejoramiento hidráulico de quebrada los castaños, sector Colonia Nacional.**

**Ubicación:** Jurisdicción de El Progreso, departamento de Cortés.

**Coordenadas** 411877.00 m E; 1700649.00 m N.

- 3) **Cierre provisional de tramos de bordo margen derecha del río Ulúa sectores Campo Buena Vista y Campo las Flores.**

**Ubicación:** Jurisdicción de El Progreso, departamento de Cortés.

**Coordenadas** 411868.10 m E; 1705401.62 m N y 413335.00 m E; 1708976.00 m N

**Objetivos de los proyectos:** Realizar en el cierre provisional de tramo de bordo fallado que permita garantizar la protección de la población y sus bienes de la Colonia Omonita y La Colonia la Democracia, Campo Buena Vista y Las Flores ante la eminente presencia de frente fríos de la temporada según lo pronosticado por CENAOS de la comisión permanente de contingencias (COPECO) que podrían generar precipitaciones que conlleven ha aumento del nivel del río Ulúa; además se realizara una canalización en el cauce de la quebrada los castaños para un mejoramiento hidráulico que permita la libre circulación del flujo mitigando así daños en la zona y sus alrededores y Realizar en el cierre provisional de tramo de bordo fallado que permita garantizar la protección de la población y sus bienes de la Colonia Nacional, Col. Palermo, Barrio San Antonio y El Centro Penal de El progreso Yoro, ante la eminente presencia de frente fríos de la temporada según lo pronosticado por CENAOS de la comisión permanente de contingencias (COPECO) que podrían generar precipitaciones que conlleven ha aumento del nivel del río Ulúa; además se realizara una canalización en el cauce de la quebrada los castaños para un mejoramiento hidráulico que permita la libre circulación del flujo mitigando así daños en la zona y sus alrededores.



**Objetivo general de la Consultoría:** Contratar los servicios de un Consultor especializado en supervisión de obras de protección y control de inundaciones con el propósito de garantizar que los trabajos se ejecuten conforme a las disposiciones generales y especificaciones técnicas establecidas para asegurar la inversión pública y reducir el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres naturales que afectan a la región del Valle de Sula.



### Definiciones:

1. **La Comisión** es el órgano Contratante denominado **Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula** responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las Obras.
2. **El Consultor** es la persona natural o jurídica contratada por el órgano responsable de la contratación para supervisar la ejecución de las Obras, debiendo ejercer sus funciones bajo la coordinación y control de la respectiva unidad ejecutora.
3. **La Lista de Cantidades Valoradas** es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.
4. **La Fecha de Terminación** es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Supervisor de Obras.
5. **El Contrato** es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar las Obras.
5. **El Contratista** es la persona natural o jurídica, cuya oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.
6. **El Precio del Contrato** es el precio establecido en la Notificación de la Resolución de Adjudicación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
7. **Días** significa días calendario.
8. **Días hábiles administrativos** todos los del año excepto los sábados y domingos y aquellos que sean determinados como feriados nacionales.
9. **Meses** significa meses calendario.
10. **Los Planos** son documentos gráficos, incluidos en el contrato, que definen el trabajo a realizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante, de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

**El Precio Inicial del Contrato** es el Precio del Contrato indicado en la



Notificación de la Resolución de Adjudicación del Contratante.

12. **Especificaciones** significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Contratante.
13. **La Fecha de Inicio** es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.
14. **Fuerza Mayor** significa un suceso o circunstancia excepcional.

### III. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS:

#### Objetivos específicos de la Consultoría:


Para alcanzar el objetivo general de la consultoría se requiere que el **Consultor** preste sus servicios profesionales a fin de que **la Comisión** posea garantía de que las obras se ejecuten conforme a las disposiciones generales y técnicas establecidas y asegure su inversión.

Los servicios requeridos del Ingeniero Supervisor son los siguientes:

1. Representar a **la Comisión** en el sitio de las obras.
2. Apoyar a **la Comisión** en la administración del proyecto.
3. Revisar el proyecto, incluyendo planos, especificaciones técnicas u otros documentos técnicos, antes del inicio de la construcción y formular las recomendaciones que procedan.
4. Emitir dictamen sobre el programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras presentado por el contratista, previo a su aprobación, ajustándose al plazo estipulado en el contrato, presentar informes quincenales y mensuales sobre su ejecución a fin de verificar el avance del proyecto, así como pronunciarse sobre su actualización o modificación.



5. Velar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de sus funciones, responsabilidades y obligaciones contraídas con **la Comisión** de acuerdo a la documentación contractual.
6. Llevar el control y el seguimiento de la ejecución del contrato, y velar porque el Contratista ejecute las obras de acuerdo a los planos y especificaciones generales y técnicas establecidas, incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los materiales, aprobando o rechazando su incorporación, registrando las incidencias en la bitácora del proyecto, misma que deberá permanecer en el sitio de la obra.
7. Vigilar y exigir el cumplimiento de las actividades relacionadas con el control de la calidad de la obra, practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos de densidad de suelos y análisis de materiales para verificar su compatibilidad con las especificaciones acordadas.
8. Velar porque los materiales, equipamiento y otros insumos utilizados en construcción previamente sean analizados, estudiados y aprobados.
9. Dirigir y administrar las oficinas y personal bajo la responsabilidad de la Supervisión del proyecto.
10. Convocar reuniones según sea necesario con el Contratista y los representantes técnicos de **la Comisión**, así como representantes de las Alcaldías Municipales de San Manuel para el proyecto 1 y El Progreso para los proyectos 2 y 3; y otras entidades u organizaciones interesadas.
11. Elaborar informes quincenales y mensuales o cuando se requieran sobre el avance físico y financiero del proyecto.
12. Revisar los planos de taller y velar porque se elaboren en tiempo y forma.
13. Autorizar pagos al contratista por obra ejecutada, con base en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados, verificando la presentación correcta de la estimación de obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe sobre adelanto y progreso físico y financiero del proyecto y la evolución de los trabajos.



14. Revisar y certificar los informes con la debida anticipación, órdenes de cambio y modificaciones por incremento o disminución de costo, ampliaciones de plazo de contrato, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el presupuesto.
15. Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones ambientales previstas en el contrato en el área de trabajo.
16. Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas de mitigación ambiental, higiene y seguridad en el proyecto.
17. Vigilar que el Contratista observe, acate y ejecute el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad para prevención de contagio del Covid 19 en el proyecto.
18. Llevar el control de las garantías y seguros objeto del contrato de construcción.
19. Documentar y emitir opinión sobre los incumplimientos del contratista especialmente los que den lugar a la imposición de multas de conformidad a la naturaleza de la obra que supervisa o a la resolución del contrato.
20. Solicitar al contratista, cuando exista causa justificada, el cambio de personal que no mostrare eficiencia en su desempeño así como de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente, aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal reemplazado.
21. Revisar y aprobar la elaboración de planos finales (Muestra el proyecto tal como se construyó) preparados por el contratista.
22. Notificar al contratista de todos los defectos que tenga conocimiento antes de finalizar los trabajos, el cual lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación.
23. Presentar un informe final completo y detallado de la ejecución del proyecto.

#### IV. CONDICIONES ESPECIALES.- RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR:


- a) Desarrollará sus actividades con la debida diligencia en el desarrollo de la Supervisión y mantendrá relaciones satisfactorias con el personal de la Comisión y otros grupos involucrados en las diversas áreas de la supervisión.



- b) En la prestación de las actividades motivo de éste Contrato, actuará de acuerdo al mejor interés de **la Comisión**, durante el desarrollo de su trabajo, presentando un comportamiento acorde por las normas generalmente aceptadas de la conducta profesional.
- c) A fin de coordinar y discutir criterios, establecerá si los trabajos se están ejecutando de acuerdo a lo requerido y proyectado por **la Comisión**, asimismo se compromete a participar en reuniones de trabajo tan frecuentemente como fuera necesario, o bien, cuando **la Comisión** lo solicite. Durante estas reuniones presentará a **la Comisión**, la evaluación descriptiva y gráfica del avance de los trabajos y su relación con el programa de actividades aprobado. Se discutirá además, problemas que se hayan presentado en la realización de las actividades y si ellos hubiesen causado alguna demora, se harán las reprogramaciones necesarias. A la vez hará exposición de la forma como se realizarán los trabajos inmediatos y someterá a consideración de **la Comisión**, las decisiones técnicas y administrativas consideradas de gran importancia para el buen éxito y finalización de la Supervisión en el tiempo programado.
- d) Tendrá la obligación de preparar las Ayudas de Memoria de la Reuniones, destacando los compromisos adquiridos por cada una de las partes y suministrar copias a los asistentes y al Contratante, ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella.
- e) Actuará de acuerdo a los mejores intereses de **la Comisión** en todo lo relacionado con la Supervisión.

#### RESPONSABILIDAD DE LA CCIVS:

- a) **La Comisión**, de acuerdo con sus facultades y recursos, proveerá al **Consultor** de toda la asistencia, que sea necesaria para obtener la información existente, relacionada con la Consultoría. b) **La Comisión**, se compromete a ejecutar con la debida diligencia, la revisión, aprobación, aceptación y autorización de requisiciones de pago.
- c) **La Comisión**, supervisará el cumplimiento de las obligaciones de **el Consultor** con el objeto de proteger los intereses del Gobierno de Honduras y asegurarse que **el Consultor** cumpla con sus obligaciones, salvo que se especifique otra disposición, la supervisión de los **Servicios** será ejercida por el Coordinador de proyecto quien podrá dirigir órdenes e instrucciones a **el Consultor** para la correcta ejecución de este contrato, de acuerdo con los




objetivos específicos de las actividades, condiciones especiales, presentación de informes, otra documentación requerida, obligaciones y responsabilidades. Con tal propósito los representantes de **la Comisión**, llevarán a cabo entre otras, las siguientes tareas: 1) Verificar el cumplimiento de las actividades que corresponden a **el Consultor** bajo este Contrato, para comprobar que sean ejecutadas con eficiencia razonable; 2) Verificar que el trabajo sea llevado a cabo por el personal apropiado y que se sigan buenas prácticas profesionales.

#### V. INFORMES Y OTRA DOCUMENTACIÓN:

**El Consultor** preparará y someterá a consideración de **la Comisión**, los siguientes informes relacionados con las actividades contempladas en éste Contrato:

- a) Informe de estimación por avance de obra (IE): Se requerirá un informe original, además una copia digital; tal informe será preparado por **el Consultor** para ser sometidos por **la Comisión** en los primeros **tres (3) días calendario** después del periodo estimado, reservándose el derecho **la Comisión**, de retener el pago parcial o total si se incumple con lo estipulado. Proveerá información relacionada con el avance físico y financiero ejecutado tanto por El Contratista de obra como por **el Consultor**, y demás actividades realizadas, condiciones del estado del tiempo, modificaciones en el alcance de tiempo y/o monto de contrato, listado de personal y equipo utilizado, con los resultados obtenidos, recomendaciones, observaciones, gastos incurridos, disponibilidad de fondos, y cualquier otra información que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografías a color, anexos, etc.; dicho informe deberá foliarse en todas las hojas bajo la nomenclatura **IE#(insertar # de informe)\_hoja #/# total**.
- b) Informe final (IF): Se requerirá un informe original y una copia impresa, además una copia digital; tal informe será preparado por **el Consultor** para ser sometidos por **la Comisión** en los primeros **cinco (5) días calendario** después de haber remitido acta provisional del proyecto y antes del último pago, reservándose el derecho **la Comisión**, de retener el pago parcial o total si se incumple con lo estipulado. Proveerá información relacionada con descripción de las actividades realizadas en todas las fases incluyendo obra adicional, condiciones del estado del tiempo, modificaciones



en el alcance de tiempo y/o monto de contrato, listado de personal y equipo utilizado, indicadores de eficiencia y eficacia del contratista de obra, aprobación de planos finales según construido y manuales de mantenimiento proporcionados por El Contratista, revisión de calidad de obra con los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, estado de cuenta financiero, y cualquier otra información que se considere necesaria, debidamente respaldada mediante fotografías a color (original y copia), anexos, etc.; dicho informe deberá foliarse en todas las hojas bajo la nomenclatura **IF#(insertar # de informe)\_hoja #/# total.**

#### **VI. VALIDEZ, VIGENCIA Y DURACIÓN DE LA CONSULTORIA:**

El Contrato tendrá validez o efecto a partir en que esté debidamente firmado por las partes Contratantes.



El plazo de ejecución del trabajo de todos los servicios objeto de la consultoría será conforme a lo siguiente:

- 1) Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de río Ulúa sector Colonia la Democracia. (30 días calendarios).**
- 2) Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha y mejoramiento hidráulico de quebrada los castaños, sector Colonia Nacional. (30 días calendarios).**
- 3) Cierre provisional de tramos de bordo margen derecha del río Ulúa sectores campo Buena Vista y campo Las Flores. (35 días calendario).**

Contados a partir de la fecha en que se fije la Orden de Inicio por escrito que emita la **Comisión**, el cual podrá ser prorrogable a petición de la misma, por el tiempo que sea necesario.

#### **VII. PENALIDAD:**

El incumplimiento o retrasos en las obligaciones acciones u omisiones imputables en el ejercicio de las funciones del **Consultor** incurrirá en la aplicación de una multa equivalente al **CERO PUNTO TREINTA Y SEIS POR CIENTO (0.36%)** del monto del contrato por cada día de atraso, según lo dispone el artículo 75 de las Disposiciones Generales de Ingresos y Egresos de La Republica vigente, cantidad que le será deducida de los pagos pendientes a su favor.



### VIII. REQUISITOS PREVIOS A LA EMISION DE LA ORDEN DE INICIO:

Antes de proceder a la emisión de la orden de inicio y de acuerdo al artículo N°. 68 de la Ley de Contratación del Estado, **el Consultor** deberá presentar la siguiente documentación: 1) Garantía de cumplimiento de contrato; 2) Nómina del personal apoyo a utilizar; 3) El listado del equipo logístico a utilizar.

### IX. PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA:


El Costo de los servicios de la Consultoría por proyecto se estimará según cuadro de costos de oferta.

### FINANCIAMIENTO:

Para el financiamiento de ésta consultoría, se hará de acuerdo a las cantidades y montos expresados en la tabla de la cláusula IX, con fondos del Gobierno de la Republica de Honduras asignados a la **Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula**, según Cuenta de la Tesorería General de la República, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

### X. CAUCIONES:

**El Consultor** debe rendir una caución del **QUINCE POR CIENTO (15%)** del monto total de los honorarios profesionales para garantizar el cumplimiento del presente Contrato, dicha caución deberá ser presentada con la misma fecha tanto en la emisión como en la vigencia de la misma y será obligatoria para extenderle la ORDEN DE INICIO a más tardar dentro de los **CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS** siguientes de haberse firmado el Contrato, la cual será extendida a partir de la fecha de vigencia de la garantía y deberá reunir los siguientes requisitos: a) Su vigencia terminará **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** después de haber vencido el plazo previsto para la prestación de los servicios profesionales; b) En el caso que **el Consultor** solicite una ampliación del plazo de ejecución establecido en el contrato, **por un término mayor de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO** deberá ampliar la vigencia de la garantía de cumplimiento de contrato de manera que venza **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO** después del nuevo plazo establecido y de no legalizarse dicha modificación



o cualquier otra en el término de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la solicitud formal, **la Comisión** intervendrá la caución para garantizar el cumplimiento del Contrato; c) Las cláusulas de las condiciones generales de la caución y de las condiciones especiales si las hubiese, que sean incompatibles con lo establecido en el contrato se tendrán como no puestas; d) Una vez comprobadas las causas de rescisión establecidas en el contrato, la Institución que haya emitido la caución rendida, deberá hacerla efectiva en el momento que **la Comisión** requiera su pago a más tardar en un término de SIETE (7) DIAS CALENDARIO por lo que debe incluirse en la cual fuese la caución presentada la cláusula: “La presente (fianza, garantía, cheque certificado) será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento de la Comisión para El Control de Inundaciones del Valle de Sula, sin más trámite que la presentación de la misma acompañada de un certificado de incumplimiento emitido por el Director Ejecutivo de La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan o limiten esta disposición.

#### **XI. AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONSULTORIA:**

El plazo de ejecución de la **Consultoría para la supervisión de proyectos** podrá ser ampliado por las siguientes causas: a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se entenderán los acontecimientos imprevistos fuera del control no atribuible a faltas por negligencia del **Consultor**, incluyendo pero no limitándose a actos de enemigos públicos, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, etc.- El Contrato de supervisión del proyecto podrá ser ampliado en el plazo por estas causas, cuando a juicio de **la Comisión** se justifique la determinación a tomarse, o darse por terminado de acuerdo a lo establecido en esta cláusula o en cualquier momento, durante el período de la supervisión se presentaren lluvias de gran intensidad y/o de larga duración en las zonas de trabajo; y/o también se dieran lluvias en la cuenca media y alta del Valle de Sula y/o se hicieran descargas de caudales desde la represa hidroeléctrica FRANCISCO MORAZÁN, lo cual impida al **Consultor** finalizar la consultoría de supervisión de las obras que tiene a su cargo; debiendo presentar el informe respectivo a **la Comisión** adjuntando los reportes meteorológicos y/o de la Empresa de Energía Eléctrica (ENEE) a fin de conformidad previa aprobación de **la**



**Comisión.** El **Consultor** deberá notificar dentro de los tres (3) días hábiles posteriores al evento que origino el atraso; b) Por incremento en el alcance de la obra no contemplada originalmente, la cual debe ser aprobada por **la Comisión**.

## XII. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Definición. Por Fuerza Mayor se entenderá todo acontecimiento ocurrido por causas imprevistas fuera del control humano no atribuible a faltas por negligencia del **Consultor**, incluyendo pero no limitándose a catástrofes de la naturaleza, del enemigo público, actos de otros Consultores o Contratistas en la ejecución de trabajos encomendados por **la Comisión**, incendios, terremotos, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, huelgas; b) Terminación de Contrato por Fuerza Mayor.- Siempre que se presente una situación o evento que surja por circunstancias de fuerza mayor y que no permitan **al Consultor** o a **la Comisión**, realizar sus obligaciones en este contrato total o parcialmente, obligando a suspender sus actividades, la parte afectada notificará a la otra inmediatamente, y de persistir dicha situación por un período que exceda de **QUINCE (15)** días calendario, tendrá derecho a dar por terminado el contrato; c) Extensión del plazo por Fuerza Mayor.- En el caso de que una Fuerza Mayor impida al **Consultor** ejecutar los deberes requeridos por este Contrato para la eficiente ejecución de las actividades por un período continuo que exceda a **CINCO (05)** días calendario de su período de servicios, tal como lo requiere el contrato y previa aprobación de **la Comisión**, será ampliado por un período de igual tiempo al período por Fuerza Mayor; d) **La Comisión** podrá suspender con causa justificada la prestación de los servicios, en todo o en parte, en el o los momentos que lo estime necesario, sin ningún tipo de perjuicio para él, previo aviso por escrito; de ahí en adelante, **el Consultor** solo podrá reiniciar la prestación de sus servicios cuando por escrito le sea indicado por **la Comisión**; e) **El Consultor** podrá suspender la ejecución del proyecto en caso de fuerza mayor, si ésta impide ejecutar con normalidad los trabajos por un periodo que exceda a **CINCO (05)** días calendario continuos; y notificará a **la Comisión**, éste verificará las causas de la suspensión y la magnitud del atraso, y si éste fuese justificado, dará la prórroga para completar los trabajos luego del reinicio de las mismas.



### XIII. OBLIGACIONES.- SON OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:

- a) Deberá realizar al menos 25 visitas al proyecto 1); 25 visitas al proyecto 2); 30 visitas al proyecto 3) y permanecer un mínimo de 5 horas en cada proyecto.
- b) Exigir al Contratista una Bitácora, numerada y sellada, como un registro del Proyecto, anotando incidentes, consultas, entrega de documentos, visitas oficiales, estado climatológico del tiempo; la bitácora estará accesible y a disposición tanto del Contratista como del Supervisor y debe ser leída y firmada a diario por sus representantes, sin perjuicio de la Supervisión del departamento de Ingeniería de **la Comisión**.
- c) Debe tener permanentemente en el campo un Inspector que vigilará la calidad de las obras en el proyecto.
- d) Presentar a **la Comisión** el programa de trabajo de los Contratistas aprobados por ellos y rendir informes quincenales, indicando los avances de las Obras ejecutadas durante períodos determinados en la forma que le sea establecido por el Departamento de Ingeniería de la Institución debiendo ser presentados con la mayor celeridad cuando se trate de situaciones que puedan afectar el cumplimiento normal del contrato, así mismo, como su avance de obra en físico y económico y deberá presentar un informe acompañando cada Estimación de trabajo que sea preparada por el Contratista, con fotografías a color que muestren el avance de las obras.
- e) Las demás atribuciones establecidas en el Artículo N°. 217 del Reglamento de La Ley de Contratación del Estado, según lo estipulado con el Artículo N°.82 de la Ley de Contratación del Estado.
- f) Desarrollar las mejores prácticas de la Ingeniería Civil de carácter técnico, económico y administrativo.
- g) Suministrar todo el personal y logística necesaria asumiendo la responsabilidad técnica para el desarrollo de los servicios requeridos antes, durante y después de finalizadas las obras.
- h) Firmar las actas de recepción final de conformidad con las especificaciones de **la**



#### XIV. RESPONSABILIDAD. - SON RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR:


- a) Supervisar la ejecución del proyecto con el propósito de velar por la buena calidad de la obra y hacer que se cumplan las especificaciones técnicas para la buena ejecución del proyecto.
- b) Inspeccionar todo el trabajo de control y aprobación de la calidad, eficiencia y cantidad de equipo.
- c) Revisar y certificar estimaciones de pago, programas, informes y notificará a **la Comisión** tan pronto como sea posible de cualquier hecho o condición que pueda demorar la terminación del proyecto.
- d) Velar porque las obras se realicen de la mejor forma y de acuerdo a los diseños preparados por el Departamento de Ingeniería.
- e) Responsable por las acciones u omisiones que le fueren imputables en el ejercicio de sus funciones, mediando negligencia o dolo según lo establece el artículo 219 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

#### XV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

**La Comisión y el Consultor** de común acuerdo podrán en cualquier momento en forma escrita, hacer cambios dentro de los términos del contrato tales como un aumento en el alcance de la **consultoría para la supervisión de proyectos** o en el plazo necesario para su ejecución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Si durante la vigencia del contrato **la Comisión** solicita trabajos adicionales o distintos a los establecidos contractualmente se solicitará por escrito una propuesta económica en función al alcance de dichos trabajos, la cual se estudiará y si ésta conviene a los intereses de **la Comisión** firmará la modificación de contrato, la cual se sujetará a lo establecido en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

Si durante la vigencia del Contrato **la Comisión** solicita ampliación en el plazo necesario para la ejecución del mismo por motivos de fuerza mayor debidamente justificado, **el Consultor** podrá reclamar gastos extraordinarios en que haya incurrido razonablemente y



necesario dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al evento que originó la fuerza mayor, caso contrario perderá derecho a reclamo, se solicitará por escrito un desglose de gastos en función al alcance del reclamo, la cual se estudiará y si ésta conviene a los intereses de **la Comisión** firmará la modificación de contrato, la cual se sujetará a lo establecido en los artículos 121, 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado y 202, 203, 204, 205 y 206 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

La **Comisión** no reconocerá costos adicionales al Contrato de consultoría, si **el Consultor** por causas no justificadas e imputables a él mismo, dejase de cumplir con éste contrato. En tal caso, se obliga por sus propios medios a cumplir con éste contrato a satisfacción de **la Comisión**.

#### **XVI. FORMA DE PAGO:**

La forma de pago será conforme a la presentación del respectivo informe de estimación y al cuadro de cantidades establecido.

Estos pagos serán hechos a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).

#### **XVII. SUPERVISIÓN:**

La supervisión de sus servicios será ejercida por el Coordinador de proyectos, el jefe del departamento de Ingeniería de **la Comisión** y en su caso por el Director Ejecutivo, quien presentará sus comentarios y la objeción o no, para el pago parcial o final de los Servicios profesionales de **Consultoría para la supervisión de proyectos**.

#### **XVIII. RETENCIÓN EN GARANTÍA:**

Se le hará al **Consultor** retención del diez por ciento (10%) del pago en concepto de los Honorarios Profesionales, tal como está descrito en el cuadro de estimado de costos, como Garantía de ejecución correcta de los servicios hasta la recepción satisfactoria de la Supervisión, de conformidad a lo establecido en el artículo No 106 de la Ley de Contratación del Estado. Los cuales serán devueltos al igual que la garantía de cumplimiento una vez verificada y recibidos los servicios objeto del contrato. Esta disposición no será interpretada



como que eximiera al **Consultor** de su completa responsabilidad en cuanto a la buena calidad de los servicios de supervisión realizados por los cuales se han hecho pago o por cualquier error u omisión en la ejecución del servicio requerido y no se interpreta la misma como renunciación del derecho de **la Comisión** para exigir el cumplimiento del Contrato.

#### **XIX. RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA:**

De acuerdo al Artículo N°.50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al **Consultor** se le retendrá por concepto del impuesto sobre la renta el **doce punto cinco (12.5%) por ciento** del pago en concepto de los Honorarios Profesionales por cada contrato, lo cual podrá eximirse al presentar el **Consultor** una constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta emitida por el Sistema de Administración de Rentas (SAR).

#### **XX. SUB-CONTRATACION:**

**El Consultor** no podrá asignar, transferir, comprometer, subcontratar o hacer cualquier otra transacción por el contrato o cualquier parte del mismo, derechos, reclamos u obligaciones del **Consultor** establecidos, excepto con el consentimiento por escrito de **la Comisión**.

La cesión o sub contratación se sujetará en lo que fuere pertinente y aplicable al contrato, a lo dispuesto en los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la Ley de Contratación del Estado.



#### **XXI. CAUSAS DE RESCINSION:**

**La Comisión** podrá rescindir el Contrato de consultoría en los casos siguientes:


- 1) Cuando el **Consultor** no presente la caución de Garantía de Cumplimiento de Contrato dentro de los CINCO (05) días calendarios siguientes de haberse firmado el contrato;
- 2) Porque el **Consultor** previa comprobación, deje de cumplir con cualquiera de las obligaciones y responsabilidades a su cargo derivadas del Contrato;
- 3) El contrato podrá ser rescindido dentro de los primeros CINCO (05) días calendario después de la firma del mismo, sin ninguna obligación de ambas partes o por decisión unilateral de las partes;

4) Por vencimiento del plazo del contrato acordado por las partes;

5) Por mutuo consentimiento;



- 6) Por muerte de **el Consultor** o incapacidad física o mental del mismo que haga imposible el cumplimiento del contrato;
- 7) Por incumplimiento de las obligaciones contraídas por **el Consultor**;
- 8) Cuando **el Consultor** sea condenado por los Juzgados o Tribunales con privación de su libertad por delitos cometidos;
- 9) Por decisión unilateral de las partes;
- 10) Por caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución;
- 11) Cuando el Titular de **la Comisión** pierda la confianza en **el Consultor** en la prestación de sus servicios;
- 12) Por irregularidades practicadas por **el Consultor** en menoscabo a los intereses del Estado;
- 13) Por la no secretividad que por su naturaleza debe mantener en los casos que se le hayan encomendado;
- 14) Por todo daño material causado dolosamente a los edificios o equipo de oficina, vehículos, instrumentos y demás objetos relacionados;
- 15) Toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;
- 16) Todo acto inmoral o delictuoso que **el Consultor** cometa en el establecimiento o lugar donde presta sus servicios cuando sea debidamente comprobado ante la autoridad competente;
- 17) Por la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del **Consultor** que haga imposible el cumplimiento del contrato;
- 18) Por razones presupuestarias establecidas en el Artículo 77 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos, Ejercicio Fiscal 2020;
- 19) **La Comisión** se reserva el derecho de terminar el contrato a su conveniencia sin responsabilidad de su parte, para lo anterior dará una notificación por escrito con **UN (01) día hábil** de anticipación a **el Consultor** de la terminación de los servicios objeto del contrato;
- 20) **El Consultor** tendrá el derecho de terminar el Contrato si por razones de Fuerza Mayor es imposible continuar los servicios indicados en él; en todo caso notificará por escrito a **la Comisión** con **DOS (02) días hábiles** de anticipación a esta terminación. Así mismo este



contrato puede ser resuelto por las demás causas establecidas en el Artículo 127 de la Ley de Contratación del Estado y 253 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

## XXII. INDEMNIZACIONES:

Durante la ejecución del contrato el **Consultor** acuerda indemnizar y defender a su costa a **la Comisión**, sus funcionarios, agentes y empleados de cualquier acción legal por causa de difamación y toda clase de reclamos, demandas, acciones, incluyendo la violación de propiedad literaria, patentes o registros de invención, artículos o herramientas originados directamente de acciones u omisiones legales del **Consultor** en relación con la supervisión. El **Consultor** será responsable ante **la Comisión** por la eficiencia y cuidadosa operación de cualquier equipo no fungible, que este utilizando para ejecutar este contrato y que tuviese que ser entregado a **la Comisión** a la conclusión del mismo. Es entendido y convenido que tal equipo será entregado a **la Comisión** en condiciones normales de operación reconociéndose como válido únicamente el desgaste normal del mismo.

## XXIII. COMUNICACIONES:

Todas las comunicaciones contempladas por este contrato serán válidas solamente cuando fuesen hechas por escrito por carta o correo electrónico, en las direcciones establecidas contractualmente.

## XXIV. ARCHIVO Y PROPIEDAD DE DOCUMENTOS:

**La Comisión** será el propietario de toda la documentación e información que surja como resultado de la Consultoría de supervisión. Toda la información obtenida durante la ejecución del Contrato por parte del **Consultor** así como todos los informes y recomendaciones, serán considerados como confidenciales por parte del **Consultor** y no podrán ser utilizados o divulgados para otros fines sin Autorización escrita de **la Comisión**.



## XXV. CONFLICTO DE INTERESES:

El **Consultor** no trabajará directa o indirectamente para su beneficio personal ni en su nombre ni a través de ninguna otra persona, en ningún negocio, profesión u ocupación haciendo uso de información obtenida por medio del contrato.

## XXVI. FINIQUITO DE FINALIZACIÓN DE CONTRATO:

Al recibir la **Comisión** el informe final a entera satisfacción suya se dará por terminado toda actividad, obligaciones y responsabilidades contenida en el Contrato y es entendido que las partes contratantes deberán a solicitud de cualquiera de ellas otorgar dentro de un plazo de treinta (30) días calendario un finiquito amplio, descargándose recíprocamente de toda clase de responsabilidades provenientes de la ejecución del contrato, u expresar por escrito todas las causas por las que no se otorga tal finiquito, sin perjuicio de las responsabilidades profesionales que normalmente corresponden al **Consultor** de acuerdo a lo establecido en las leyes de Honduras.

## XXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Es entendido que formaran parte del contrato, los siguientes documentos: a) Términos de Referencia; b) Carta de oferta económica en monto en Lempiras declarando la validez de 60 días calendario a partir de la fecha de entrega; c) Notificación de adjudicación; d) Cuadro de cantidades y precios unitarios; e) Listado de personal de apoyo; f) Listado de equipo logístico; g) Constancia solvencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de no tener juicios pendientes con el Estado; h) Certificación de inscripción y clasificación del Registro de Contratistas del Estado (ONCAE); i) Constancia de solvencia vigente ante el Sistema de Administración de Rentas (SAR) en relación al ISR; j) Declaración de no estar comprendido dentro de los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado; k) Caucción de cumplimiento de contrato; l) Orden de inicio; m) Las Modificaciones; n) Finiquito de finalización.



## XXVIII. CONFIDENCIALIDAD:

Ni **El Consultor**, ni tampoco el personal a su cargo, podrán revelar durante la vigencia del contrato o después de su terminación, ninguna información confidencial o de propiedad de **la Comisión** relacionada con el proyecto, los servicios, el contrato o las actividades u operaciones sin previo consentimiento por escrito de esta última.



## XXIX. CONTROVERSIAS:

Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación del contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de ésta jurisdicción.


Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza del contrato, estará únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y con tal virtud en el goce de sus derechos se estará exclusivamente a lo que dispone ésta ley y a lo expresamente pactado en el mismo.

## XXX. INTEGRIDAD:

**La Comisión y el Consultor**, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉndonos DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,



realizar: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndolas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el **Consultor** contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará Lugar: a.- De parte del **Consultor**: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte de la **Comisión**: i. A la eliminación definitiva del **Consultor** y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar.



**XXXI. RECORTE PRESUPUESTARIO:**


En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, podrá dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato.

**XXXII. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD:**

Siendo que en la ejecución de este Contrato se observarán disposiciones adicionales y propias de bioseguridad producto de atención y prevención del COVID-19, el **Consultor** debe vigilar que se cumpla correctamente el “Protocolo de Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 para los proyectos de construcción”, como ser la compra de insumos requeridos.

**XXXIII. DISPOSICIONES:**

Los presentes términos de referencia estarán sujetos a lo establecido en el artículo 80 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la Republica 2020.



### INFORMACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Para la selección del Consultor Individual para la prestación de los servicios se propone invitar a tres participantes, de conformidad con la modalidad de contratación que determina el precio base.

**Tipo de Consultoría:** Consultoría Individual.

**Nombre de la Consultoría:** Consultoría individual para la Supervisión de los Proyectos: Lote #3, 1) Reconstrucción de tramo de bordo margen izquierda de río Ulúa sector Colonia la Democracia. 2) Reconstrucción de tramo de bordo margen derecha y mejoramiento hidráulico de quebrada los castaños, sector Colonia Nacional. 3) Cierre provisional de tramos de bordo margen derecha del río Ulúa sectores Campo Buena Vista y Campo las Flores.

Los participantes deberán presentar la siguiente documentación en su propuesta:

1) Planos impresos tamaño 8.5”x 14”, firmados y sellados, 2) Términos de Referencia, 3) Carta de oferta económica según formulario, 4) Cuadro de cantidades y precios unitarios, 5) Listado de personal de apoyo; 6) Listado de equipo logístico; 7) Declaración de no estar comprendido dentro de los art 15 y 16 LCE, 8) Constancia de solvencia del participante ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

*Todos los documentos deberán estar firmados, sellados y foliados en cada una de sus páginas.*

Los participantes *No Podrán* ofertar en monedas extranjeras. Los precios unitarios deberán ser cotizados enteramente en Lempiras.

Los participantes deberán presentar su propuesta económica para cada proyecto según carta de oferta con validez de 60 días calendario en base al cuadro de cantidades adjunto, presentando un original y una copia.

El número de copias de las ofertas que los Oferentes deberán presentar *además de la oferta original presentar una (1) copias, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.*

Los participantes *no podrán* presentar ofertas electrónicamente.



Las propuestas deberán entregarse a: la **Comisión para el control de inundaciones del Valle de Sula, CCIVS, Barrio El Benque, 7 y 8 calle, 8 avenida, S.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.** a más tardar el día y hora indicados en carta de invitación.

Las propuestas se entregarán y deberán presentarse selladas en sobres y debidamente identificado dirigido a: **Ingeniero Sergio Villatoro Cruz**, Director Ejecutivo y la referencia antes indicada con la leyenda de “NO ABRIR ANTES DEL (FECHA INDICADA)”, hasta las (HORA INDICADA) hora local. Estas propuestas se presentarán en original y una copia, marcando claramente cada ejemplar como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente.

Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación de ofertas deberán ser entregadas al contratante en la dirección indicada a más tardar **dos días** antes de la fecha indicada para presentar ofertas.

TODA OFERTA QUE SE PRESENTE DESPUES DEL PLAZO FIJADO PARA LA RECEPCION, SERA RECHAZADA Y DEVUELTA SIN ABRIR AL OFERENTE.

Todos los gastos en que incurran los participantes con motivo de la preparación de las propuestas serán por cuenta y riesgo y no serán reembolsables.

El número mínimo de ofertas para no declarar desierto el proceso será de **una** oferta;

El participante a quien se hiciera la adjudicación, deberá formalizar el Contrato dentro de los **Cinco (05) días hábiles** de su notificación por parte de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, y lo devolverá debidamente firmado, acompañado de los siguientes documentos: a) Constancia de solvencia ante el sistema de administración de rentas (SAR); b) Constancia de solvencia de la Procuraduría General de la Republica PGR; c) Constancia de solvencia de ONCAE; si en el caso que el adjudicado deje de, rechace o se descuida devolver el Contrato como aquí se dispone, se anulará la adjudicación.



## Especificaciones de proyectos


### Descripción específica de proyectos

- 1) NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO ULUA SECTOR COLONIA LA DEMOCRACIA.

#### Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en cierre de tramo de bordo en una longitud de 100.00 metros lineales con los siguientes parámetros de diseño: corona de 4.00 metros lineales, taludes 2:1 y altura variable según diseño de sección típica con un volumen total estimado de 10,490.00 metros cúbicos, de los cuales 1,455.00 metros cúbicos serán obtenidos del bordo material de sitio (bordo existente y préstamo lateral) y 7,542.00 metros cúbicos serán acarreados desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor a 7.00 kilómetros, así mismo se obtendrá material piedra con un volumen de 1,493.00 metros cúbicos para la estabilización y relleno de la base de la estructura de bordo, las rocas deberán ser igual o menores a 0.80 metros de diámetro, angulares con buen peso específico y de tal calidad que no se desintegren al estar expuestas al agua la cual el contratista comprará, cortará, cargará y transportará desde un banco de préstamo ubicado a una distancia no mayor de 14.00 kilómetros. El colocado de la roca será tal como lo indican los planos constructivos, cuyos vacíos serán rellenos con piedra de menor tamaño para su acuñaición y asegurar la estabilidad de la protección, la roca se extraerá únicamente por medios de mecánicos, bajo los requerimientos técnicos y de seguridad que se exigen para este tipo de procedimientos, además se debe incorporar una bomba achicadora para extraer el agua acumulada en socavación de la base del bordo. El proceso de compactación será en capas no mayores de 30.00 cms de espesor con movimientos de máquina transversales y longitudinales combinado con un vibro compactador “pata de cabra” hasta alcanzar la altura indicada en los planos constructivos y aplicando la humedad óptima necesaria para alcanzar un 90% mínimo de compactación Proctor Estándar, además deberá realizar los cortes del material lateral de manera que se evite la formación de oquedades o depresiones sobre los andenes y así prevenir

la acumulación de agua al pie de la estructura del bordo, realizará también la remoción del



material contaminado que se encuentre en el tramo, todos estos trabajos serán bajo la autorización del Ingeniero Supervisor.

Previo al inicio de las labores de campo se deberá realizar una visita conjunta con el Supervisor Externo de la CCIVS, Contratista y Representante de la comunidad para inspeccionar las zonas y priorizar las actividades que comprenden la reparación, debiendo la Supervisión asignada cuantificar el volumen total de obras a ejecutar conforme a Contrato de obras y la elaboración de un plan de reconstrucción conjunto que deberá ser aprobado por la CCIVS. El Contratista considerará previo al inicio de la reparación de las fallas realizar el debido saneamiento que comprende limpieza y remoción de escombros en el área de la obra, así como el debido drenaje y la estabilización de la misma; con toda la logística necesaria para realizar la obra en el tiempo estipulado. Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y características del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la información necesaria para el cálculo de su costo. El Contratista deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19.

Plazo de ejecución: 25 días calendario.

### CUADRO DE CANTIDADES


Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Estabilizacion (material piedra)	M3	1,493.00		
2.00	Relleno compactado con material del Sitio.	M3	1,455.00		
3.00	Relleno compactado con material importado.	M3.	7,542.00		
<b>TOTAL</b>					



2) NOMBRE DEL PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE QUEBRADA LOS CASTAÑOS, SECTOR COLONIA NACIONAL.

Actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en: **1.** Mejoramiento hidráulico de la quebrada Los Castaños en una longitud de 1,000.00 metros lineales con un volumen aproximado de 4,500.00 metros cúbicos, con los siguientes parámetros de diseño: canal inductor 5.00 metros lineales de plantilla, taludes 2:1, altura de corte variable según detalle, el material producto de la excavación será utilizado para la conformación del bordo. **2.** Cierre de tramo de bordo en una longitud de 800.00 metros lineales con un volumen estimado de 10,875.00 metros cúbicos, con los siguientes parámetros de diseño: corona 3.00 metros, taludes 3:1 lado húmedo y talud 2:1 en lado seco, con altura de relleno variable según detalle de sección típica, el material a utilizar será del sitio (barrido lateral y material producto de la canalización). El proceso de compactación será en capas no mayores de 15.00 cms de espesor con movimientos de máquina transversales y longitudinales dejando la rasante de la corona 15.00 cms por arriba de la rasante de la corona de los tramos adyacentes existentes. Se deberán reparar los taludes dañados con el material del sitio con su debida mecanización y proceso de compactación. Previo al inicio de las labores de campo se deberá realizar una visita conjunta con el Supervisor Externo de la CCIVS, Contratista y Representante de la comunidad para inspeccionar las zonas y priorizar las actividades que comprenden la reparación, debiendo la Supervisión asignada cuantificar el volumen total de obras a ejecutar conforme a Contrato de obras y la elaboración de un plan de reconstrucción conjunto que deberá ser aprobado por la CCIVS. El Contratista considerará previo al inicio de la reparación de las fallas realizar el debido saneamiento que comprende limpieza y remoción de escombros en el área de la obra, así como el debido drenaje y la estabilización de la misma; con toda la logística necesaria para realizar la obra en el tiempo estipulado. Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y características del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la información necesaria para el cálculo de su costo. El Contratista deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19



Plazo de Ejecución: 25 días calendarios


**CUADRO DE CANTIDADES**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Mejoramiento hidraulico	M3	4,500.00		
2.00	Relleno compactado con material del Sitio.	M3	10,875.00		
<b>TOTAL</b>					

3) NOMBRE DEL PROYECTO: CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES.

Las actividades a realizar:

Las actividades a realizar consisten en cierre provisional de tramos de bordo en una longitud total de 800.00 metros lineales con un volumen total estimado de 91,200.00 metros cúbicos comprendidos de la siguiente manera: tramo #1, con una longitud de 650.00 metros y un volumen estimado de 74,100.00 metros cúbicos con los siguientes parámetros de diseño: corona 4.00 metros, talud 2:1, altura variable según detalle de sección típica; tramo #2 con una longitud de 150.00 metros y un volumen estimado de 17,100.00 metros cúbicos con los siguientes parámetros de diseño: corona 4.00 metros, talud 2:1, altura variable según detalle de sección típica (se considerara una altura de 2.00 metros de socavación en la base de ambos tramos de bordo), el material a utilizar será del sitio (barrido lateral y material de bordo existente en el tramo #1). El proceso de compactación será en capas no mayores de 15.00 cms de espesor con movimientos de máquina transversales y longitudinales dejando la rasante de la corona 15.00 cms por arriba de la rasante de la corona de los bordos existentes en los tramos a reparar. Previo al inicio de las labores de campo se deberá realizar una visita



conjunta con el Supervisor Externo de la CCIVS, Contratista y Representante de la comunidad para inspeccionar las zonas y priorizar las actividades que comprenden la reparación, debiendo la Supervisión asignada cuantificar el volumen total de obras a ejecutar conforme a Contrato de obras y la elaboración de un plan de reconstrucción conjunto que deberá ser aprobado por la CCIVS. El Contratista considerará previo al inicio de la reparación de las fallas realizar el debido saneamiento que comprende limpieza y remoción de escombros en el área de la obra, así como el debido drenaje y la estabilización de la misma; con toda la logística necesaria para realizar la obra en el tiempo estipulado. El Contratista deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19. Se recomienda a los oferentes visitar el sitio para evaluar las condiciones y características del proyecto y sus alrededores a fin de obtener toda la información necesaria para el cálculo de su costo.

Plazo de Ejecución: 30 días calendarios

**CUADRO DE CANTIDADES**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.00	Relleno compactado con material del Sitio.	M3	91,200.00		
<b>TOTAL</b>					



## ESPECIFICACIONES GENERALES

Las normas de calidad de la mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogo que haya hecho el Contratante en las Especificaciones Técnicas son meramente descriptivas y no restrictivas.

## PLANOS DE CONTRATO

Los planos de Contrato incluyen los planos y los dibujos suplementarios que puedan ser agregados por el Ingeniero como apéndices, pudiendo aquellos ser modificados conforme a los intereses de las obras. Los planos comprendidos en este Contrato son los siguientes:

Proyecto 1): 1.- Localización y ubicación y Sección Típica.

Proyecto 2): 1.- Localización y ubicación y Sección Típica.

Proyecto 3): 1.- Localización y ubicación y Sección Típica.


El Ingeniero podrá emitir dibujos detallados e instrucciones durante el desarrollo de la obra. Exceptuando aquellos dibujos emitidos conjuntamente con órdenes de cambio, deberán ser verdaderos desarrollos de los planos deducibles de los mismos y consistentes con el alcance del trabajo incluido bajo este contrato.



**FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS**

**RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO ULUA  
SECTOR COLONIA LA DEMOCRACIA**


No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	P.U	COSTO TOTAL
<b>1</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>1.1</b>	<b>Personal Superior</b>					
1.1.1	Ingeniero Consultor Gerente de proyectos	H - Mes	1	0.33		
1.1.2	Ingeniero Supervisor residente de proyecto	H- día	30	0.33		
<b>1.2</b>	<b>Personal de campo</b>					
1.2.1	Inspector de campo (terraceria)	H- día	25	1.00		
1.2.2	Topografo	H- día	2	1.00		
1.2.3	Cadeneros	H- día	2	2.00		
1.2.4	Peones	H- día	2	4.00		
	<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>2</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>2.1</b>	<b>Materiales y suministros.</b>					
2.1.1	Materiales de oficina	Global	1	0.33		
<b>2.2</b>	<b>Gastos de operación</b>					
2.2.1	Reproduccion de documentos	Global	1	0.33		
2.2.2	Comunicación	Global	1	0.33		
2.2.3	Subsistencia Ingeniero Residente	Día	30	0.33		
2.2.4	Subsistencia Inspector de campo	Día	25	1.00		
<b>2.3</b>	<b>Utilizacion de equipo</b>					
2.3.1	Uso de vehiculo (Ingeniero Gerente de proyectos)	Mes	1	0.33		
2.3.2	Uso de vehiculo (Ingeniero Residente de proyectos)	Día	30	0.33		
2.3.3	Uso de vehiculo (topografia)	Día	2	1.00		
2.3.4	Uso de equipo de topografia	Día	2	1.00		
2.3.5	Uso de equipo de bioseguridad personal	Global	1	0.33		
	<b>SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:</b>					
<b>3</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>					
3.1	20% de Total de Sueldos y Salarios	%	20%			
3.2	15% del Total de Gastos Directos	%	15%			
	<b>SUB TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:</b>					
	<b>COSTO TOTAL:</b>					




<b>FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS</b>						
<b>RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE QUEBRADA LOS CASTAÑOS, SECTOR COLONIA NACIONAL</b>						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	P.U	COSTO TOTAL
<b>1</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>1.1</b>	<b>Personal Superior</b>					
1.1.1	Ingeniero Consultor Gerente de proyectos	H - Mes	1	0.50		
1.1.2	Ingeniero Supervisor residente de proyecto	H- día	30	1.00		
<b>1.2</b>	<b>Personal de campo</b>					
1.2.1	Inspector de campo	H- día	25	1.00		
1.2.2	Topografo	H- día	2	1.00		
1.2.3	Cadeneros	H- día	2	2.00		
1.2.4	Peones	H- día	2	4.00		
	<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>2</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>2.1</b>	<b>Materiales y suministros.</b>					
2.1.1	Materiales de oficina	Global	1	0.50		
<b>2.2</b>	<b>Gastos de operación</b>					
2.2.1	Reproduccion de documentos	Global	1	0.50		
2.2.2	Comunicación	Global	1	0.50		
2.2.3	Subsistencia Ingeniero Residente	Día	25	1.00		
2.2.4	Subsistencia Inspector de campo	Día	25	1.00		
<b>2.3</b>	<b>Utilizacion de equipo</b>					
2.3.1	Uso de vehiculo (Ingeniero Gerente de proyectos)	Mes	1	0.50		
2.3.2	Uso de vehiculo (Ingeniero Residente de proyectos)	Día	25	1.00		
2.3.3	Uso de vehiculo (topografia)	Día	2	1.00		
2.3.4	Uso de equipo de topografia	Día	2	1.00		
2.3.5	Uso de equipo de bioseguridad personal	Global	1	0.50		
	<b>SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:</b>					
<b>3</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>					
3.1	20% de Total de Sueldos y Salarios	%	20%			
3.2	15% del Total de Gastos Directos	%	15%			
	<b>SUB TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:</b>					
	<b>COSTO TOTAL:</b>					



<b>FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS</b>						
<b>CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA</b>						
<b>SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES</b>						
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO	P.U	COSTO TOTAL
<b>1</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>1.1</b>	<b>Personal Superior</b>					
1.1.1	Ingeniero Consultor Gerente de proyectos	H - Mes	1	0.33		
1.1.2	Ingeniero Supervisor residente de proyecto	H- día	30	0.33		
<b>1.2</b>	<b>Personal de campo</b>					
1.2.1	Inspector de campo (terracería)	H- día	30	1.00		
1.2.2	Topografo	H- día	2	1.00		
1.2.3	Cadeneros	H- día	2	2.00		
1.2.4	Peones	H- día	2	4.00		
	<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:</b>					
<b>2</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>					
<b>2.1</b>	<b>Materiales y suministros.</b>					
2.1.1	Materiales de oficina	Global	1	0.33		
<b>2.2</b>	<b>Gastos de operación</b>					
2.2.1	Reproduccion de documentos	Global	1	0.33		
2.2.2	Comunicación	Global	1	0.33		
2.2.3	Subsistencia Ingeniero Residente	Día	30	0.33		
2.2.4	Subsistencia Inspector de campo	Día	30	1.00		
<b>2.3</b>	<b>Utilizacion de equipo</b>					
2.3.1	Uso de vehiculo (Ingeniero Gerente de proyectos)	Mes	1	0.33		
2.3.2	Uso de vehiculo (Ingeniero Residente de proyectos)	Día	30	0.33		
2.3.3	Uso de vehiculo (topografia)	Día	2	1.00		
2.3.4	Uso de equipo de topografia	Día	2	1.00		
2.3.5	Uso de equipo de bioseguridad personal	Global	1	0.33		
	<b>SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:</b>					
<b>3</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>					
3.1	20% de Total de Sueldos y Salarios	%	20%			
3.2	15% del Total de Gastos Directos	%	15%			
	<b>SUB TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:</b>					
	<b>COSTO TOTAL:</b>					



<b>FORMATO DE OFERTA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS</b>					
<b>LOTE 3</b>					
<b>1) RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RIO ULUA SECTOR COLONIA LA DEMOCRACIA</b>					
<b>2) RECONSTRUCCION DE TRAMO DE BORDO MARGEN DERECHA Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE QUEBRADA LOS CASTAÑOS, SECTOR COLONIA NACIONAL</b>					
<b>3) CIERRE PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN DERECHA DEL RIO ULUA SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES</b>					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	COSTO TOTAL
<b>1</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS:</b>				
<b>1.1</b>	<b>Personal Superior</b>				
1.1.1	Ingeniero Consultor Gerente de proyectos	Global	1		
1.1.2	Ingeniero Supervisor residente de proyecto	Global	1		
<b>1.2</b>	<b>Personal de campo</b>				
1.2.1	Inspector de campo (terracería)	Global	1		
1.2.2	Topografo	Global	1		
1.2.3	Cadeneros	Global	1		
1.2.4	Peones	Global	1		
	<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS:</b>				
<b>2</b>	<b>GASTOS DIRECTOS</b>				
<b>2.1</b>	<b>Materiales y suministros.</b>				
2.1.1	Materiales de oficina	Global	1		
<b>2.2</b>	<b>Gastos de operación</b>				
2.2.1	Reproduccion de documentos	Global	1		
2.2.2	Comunicación	Global	1		
2.2.3	Subsistencia Ingeniero Residente	Global	1		
2.2.4	Subsistencia Inspector de campo	Global	1		
<b>2.3</b>	<b>Utilizacion de equipo</b>				
2.3.1	Uso de vehiculo (Ingeniero Gerente de proyectos)	Global	1		
2.3.2	Uso de vehiculo (Ingeniero Residente de proyectos)	Global	1		
2.3.3	Uso de vehiculo (topografia)	Global	1		
2.3.4	Uso de equipo de topografia	Global	1		
2.3.5	Uso de equipo de bioseguridad personal	Global	1		
	<b>SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS:</b>				
<b>3</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>				
3.1	20% de Total de Sueldos y Salarios	%	20%		
3.2	15% del Total de Gastos Directos	%	15%		
	<b>SUB TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES:</b>				
	<b>COSTO TOTAL:</b>				



Estimación de costos para preparar la oferta:

**Sueldos y salarios:**

Se estimará un salario para todo el periodo de la consultoría para desarrollar todas las actividades a realizar, los servicios requeridos, responsabilidades y obligaciones establecidas en los términos de referencia para el personal tales como Gerente de proyectos, Ingeniero Residente, topógrafo e Inspector de campo.

**Gastos directos:**

**Materiales y suministros:** Se estimará los costos en que se incurrirá en materiales de oficina para el periodo de la consultoría, tales como papelería, impresiones, costos de oficina, útiles de oficina, dibujo, etc., necesarios para llevar a cabo la consultoría durante el periodo de la misma.

**Gastos de operación:** Se estimará los costos en que se incurrirá tales como costos de reproducción de copias, comunicaciones, encuadernados, dibujo, preparación de informes, memorias de cálculo, subsistencia del personal, etc., necesarios para llevar a cabo la consultoría durante el periodo de la misma.

**Utilización de equipo:** Se estimará todos los insumos por el uso del vehículo del Consultor y residente, tales como combustible, lubricantes, llantas, depreciación de vehículo y todo lo relacionado con el transporte al sitio del proyecto, así como los traslados necesarios que permitan llevar a cabo la consultoría según los servicios requeridos durante el periodo de la misma.

**Honorarios Profesionales:**


**Sobre sueldos y salarios:** Se establece un valor equivalente al 20% del valor de sub total del concepto 1.

**Sobre Gastos directos:** Se establece un valor equivalente al 15% del valor de sub total del concepto 2.

**Costo Total por proyecto:** El valor total de la oferta económica es la sumatoria de los sub totales de los conceptos 1,2 y 3.

**Valor total por lote:** El precio unitario de cada concepto resulta de la sumatoria total de ese ítem por proyecto, luego se multiplica por la cantidad establecida para obtener los totales y sumarlos para costo total.

El pago de los servicios prestados se hará conforme al avance físico de cada proyecto, en caso fortuito o fuerza mayor notificar al Contratante inmediatamente para tomar las consideraciones del caso.



### Formulario de Oferta

*[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta]*

*[fecha]*

Número de Identificación y Título del Contrato: *[indique el número de identificación y título del Contrato]*

A: *[nombre y dirección del Contratante]*

Después de haber examinado los Documentos de Términos de referencia, incluyendo la(s) enmienda(s) *[liste aquí las enmiendas]*, ofrecemos ejecutar el *[nombre y número de identificación del Contrato]* por el Precio del Contrato de *[indique el monto en cifras]*, *[indique el monto en palabras]* *[indique el nombre de la moneda]*.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta por sesenta (60) días calendario exigido en los documentos de Términos de Referencia.

No estamos comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado y somos elegibles bajo las leyes hondureñas.

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Nombre del Oferente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_



## Formulario Declaración Jurada sobre Prohibiciones o Inhabilidades

Yo \_\_\_\_\_, mayor de edad, de estado civil \_\_\_\_\_, de nacionalidad \_\_\_\_\_, con domicilio en \_\_\_\_\_ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. \_\_\_\_\_ actuando en mi condición de *[Indicar el Nombre del Oferente]*, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que mi persona no se encuentra comprendida en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de \_\_\_\_\_, Departamento de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días de mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Firma: \_\_\_\_\_

Esta Declaración Jurada debe presentarse en original con la firma autenticada ante Notario (En caso de autenticarse por Notario Extranjero debe ser apostillado).



## Formulario de Garantía de Fiel Cumplimiento

### [GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

*[Insertar nombre de aseguradora o banco]*

**[GARANTIA/FIANZA] DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO N°:** *[insertar número de póliza]*

**FECHA DE EMISION:** *[insertar fecha de emisión]*

**AFIANZADO/GARANTIZADO:** *[insertar nombre del oferente]*

**DIRECCION Y TELEFONO:** *[insertar dirección y teléfono del oferente]*

**[Garantía/Fianza]** a favor de *[indicar el nombre de la institución a favor de la cual se extiende la garantía]*, para garantizar que el *[Afianzado/Garantizado]*, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el *[Afianzado/Garantizado]* y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: "*[indicar el nombre del proyecto]*", ubicado en *[indicar la ubicación]*.

**SUMA [AFIANZADA/GARANTIZADA]:** *[insertar el monto de la suma garantizada en letras y en números]*.

**VIGENCIA De:** *[insertar fecha de inicio de la vigencia]* **Hasta:** *[insertar fecha de fin de la vigencia]*.

**BENEFICIARIO:** *[insertar nombre del órgano contratante]*

**CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA:** la presente garantía será ejecutada por el valor total de la misma, a simple requerimiento del beneficiario, acompañada de una resolución firme de incumplimiento, sin ningún otro requisito, pudiendo requerirse su ejecución en cualquier momento, dentro del plazo de vigencia de la *[Garantía/Fianza]*.

En fe de lo cual, se emite la presente *[Fianza/Garantía]*, en la ciudad de *[insertar ciudad]*, Municipio de *[insertar municipio]*, a los *[insertar día]* del mes de *[insertar mes]* del año *[insertar año]*.

**FIRMA AUTORIZADA**



## FORMULARIOS PARA FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

### CHEQUE CERTIFICADO

MEMBRERTE DEL CONSULTOR

Lugar y fecha

Ingeniero  
(Nombre completo del Director Ejecutivo)  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CCIIVS

Estimado Señor Director:

Por medio de la presente se hace entrega de cheque certificado N° xxx, emitido por (INSERTAR NOMBRE DE INSTITUCION FINANCIERA), de fecha xxx, de la cuenta de cheques número xxxx, a favor de *La Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula*, por concepto de garantía de cumplimiento de Contrato N° (INSERTAR NUMERO DE CONTRATO) firmado en fecha (INDICAR FECHA DE FIRMA DE CONTRATO) para la supervisión del proyecto: “INSERTAR NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO”, jurisdicción de (INSERTAR LUGAR DE LA JURISDICCION SEGÚN CONTRATO).

MONTO: L. (valor en números y letras).

VIGENCIA: INDICAR VIGENCIA DESDE Y HASTA DEL CHEQUE CERTIFICADO.

Clausula Obligatoria:

EL PRESENTE CHEQUE CERTIFICADO SERA EJECUTADO EN SU TOTALIDAD AL SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA, SINMAS TRAMITE QUE LA PRESENTACION DEL MISMO ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EMITIDO POR EL DIRECTOR DE LA COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA.

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Firma y sello Consultor



INDICE	
No.	DESCRIPCION
1	INDICE DEL PLANO Y UBICACIÓN
2	PLANTA GENERAL
3	SECCIONES TRANSV. 0+000 -0+030
4	SECCIONES TRANSV. 0+040 -0+060
5	SECCIONES TRANSV. 0+062.52 -0+090
6	SECCIONES TRANSV. 0+091.65

## UBICACION



LEVANTO:  
VICTOR CARRANZA  
DISEÑO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA  
DIBUJO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA

REVISÓ:  
CCIVS

APROBÓ:  
ING. NEIL PATRICK DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
CRUZ  
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
RECONSTRUCCION  
DE TRAMO DE  
BORDO MARGEN  
IZQUIERDA DE  
RIO ULUA  
SECTOR LA  
DEMOCRACIA.

PROPIETARIO:  
C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:  
JURISDICCION DE  
SAN MANUEL  
DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:  
INDICE DEL  
PLANO Y  
UBICACION


ESCALA:  
SE

FECHA:  
DIC. 2020

HOJA

1 / 6

# PLANTA GENERAL

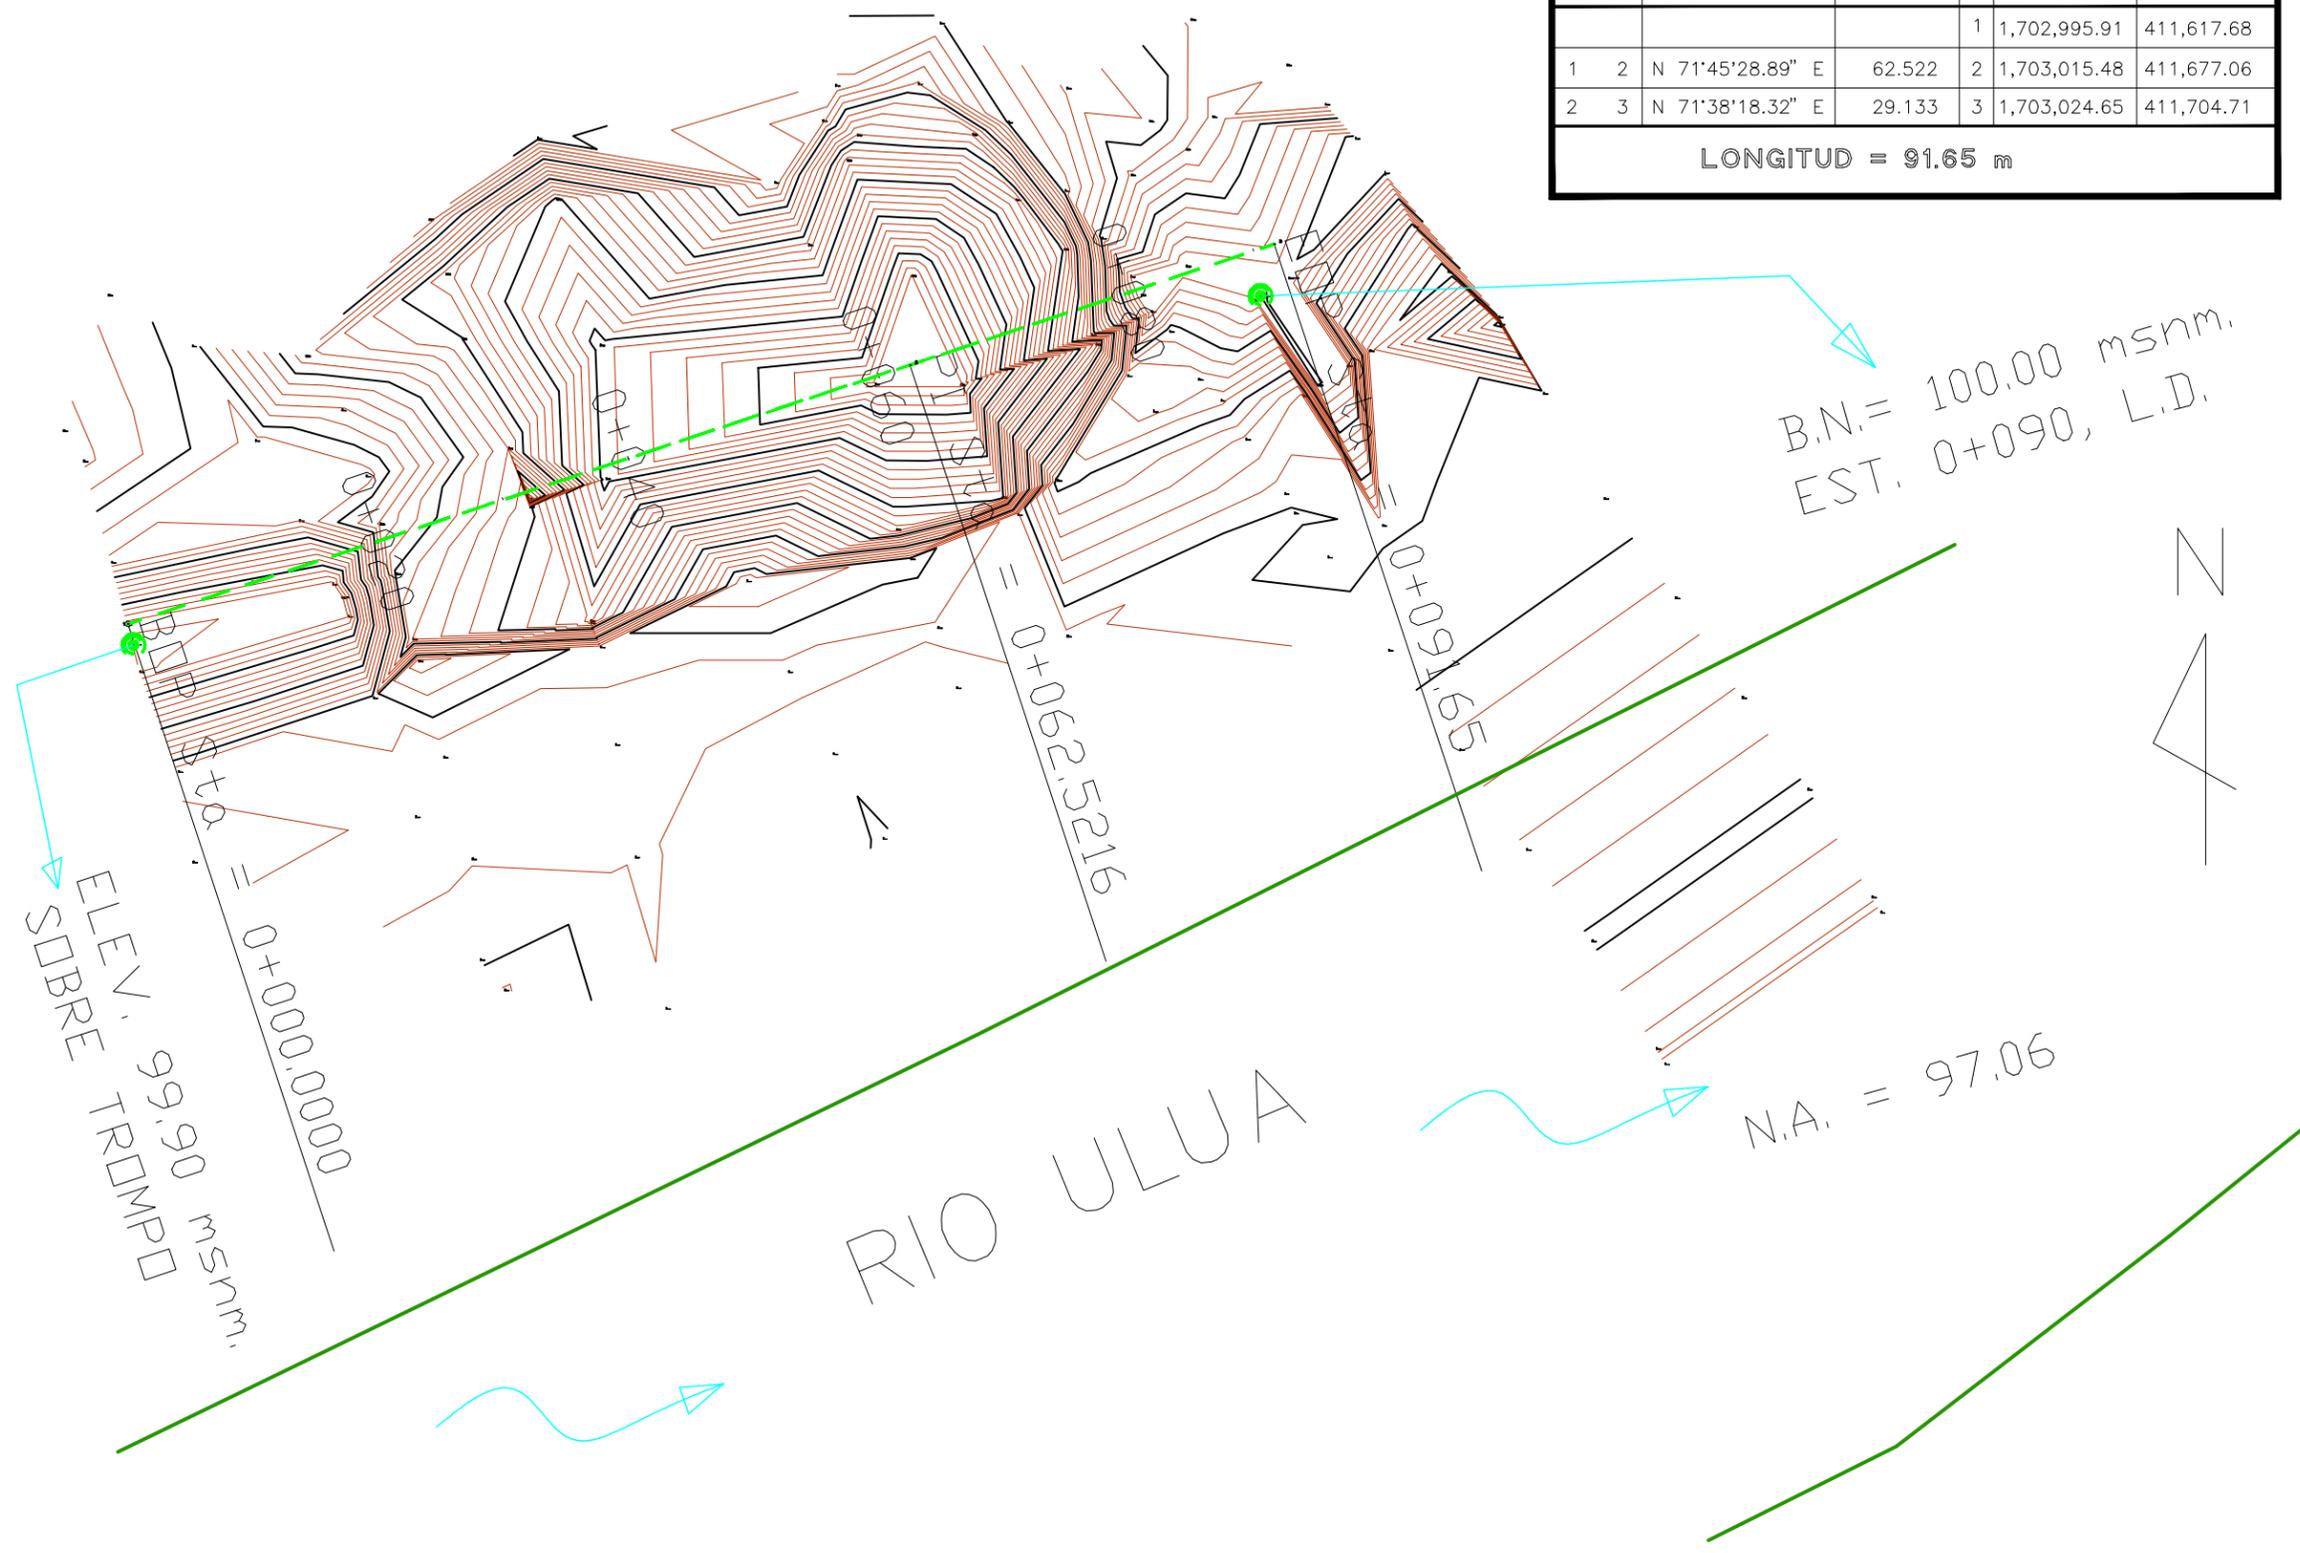

DATOS DE POLIGONO					
LADO EST	RUMBO	DISTANCIA	V	COORDENADAS UTM	
				Y	X
			1	1,702,995.91	411,617.68
1 2	N 71'45'28.89" E	62.522	2	1,703,015.48	411,677.06
2 3	N 71'38'18.32" E	29.133	3	1,703,024.65	411,704.71

**LONGITUD = 91.65 m**



**LEVANTO:**  
VICTOR CARRANZA  
DISEÑO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA  
DIBUJO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA

**REVISÓ:**  
CCIVS

**APROBÓ:**  
ING. NEIL PATRICK DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
CRUZ  
DIRECTOR CCIVS

**PROYECTO:**  
RECONSTRUCCION  
DE TRAMO DE  
BORDO MARGEN  
IZQUIERDA DE  
RIO ULUA  
SECTOR LA  
DEMOCRACIA.


**PROPIETARIO:**  
C.C.I.V.S.

**UBICACIÓN:**  
JURISDICCION DE  
SAN MANUEL  
DEPTO. DE CORTES

**CONTENIDO:**  
PLANTA  
GENERAL  
0+000 - 0+091.65

**ESCALA:**  
SE



**FECHA:**  
DIC. 2020

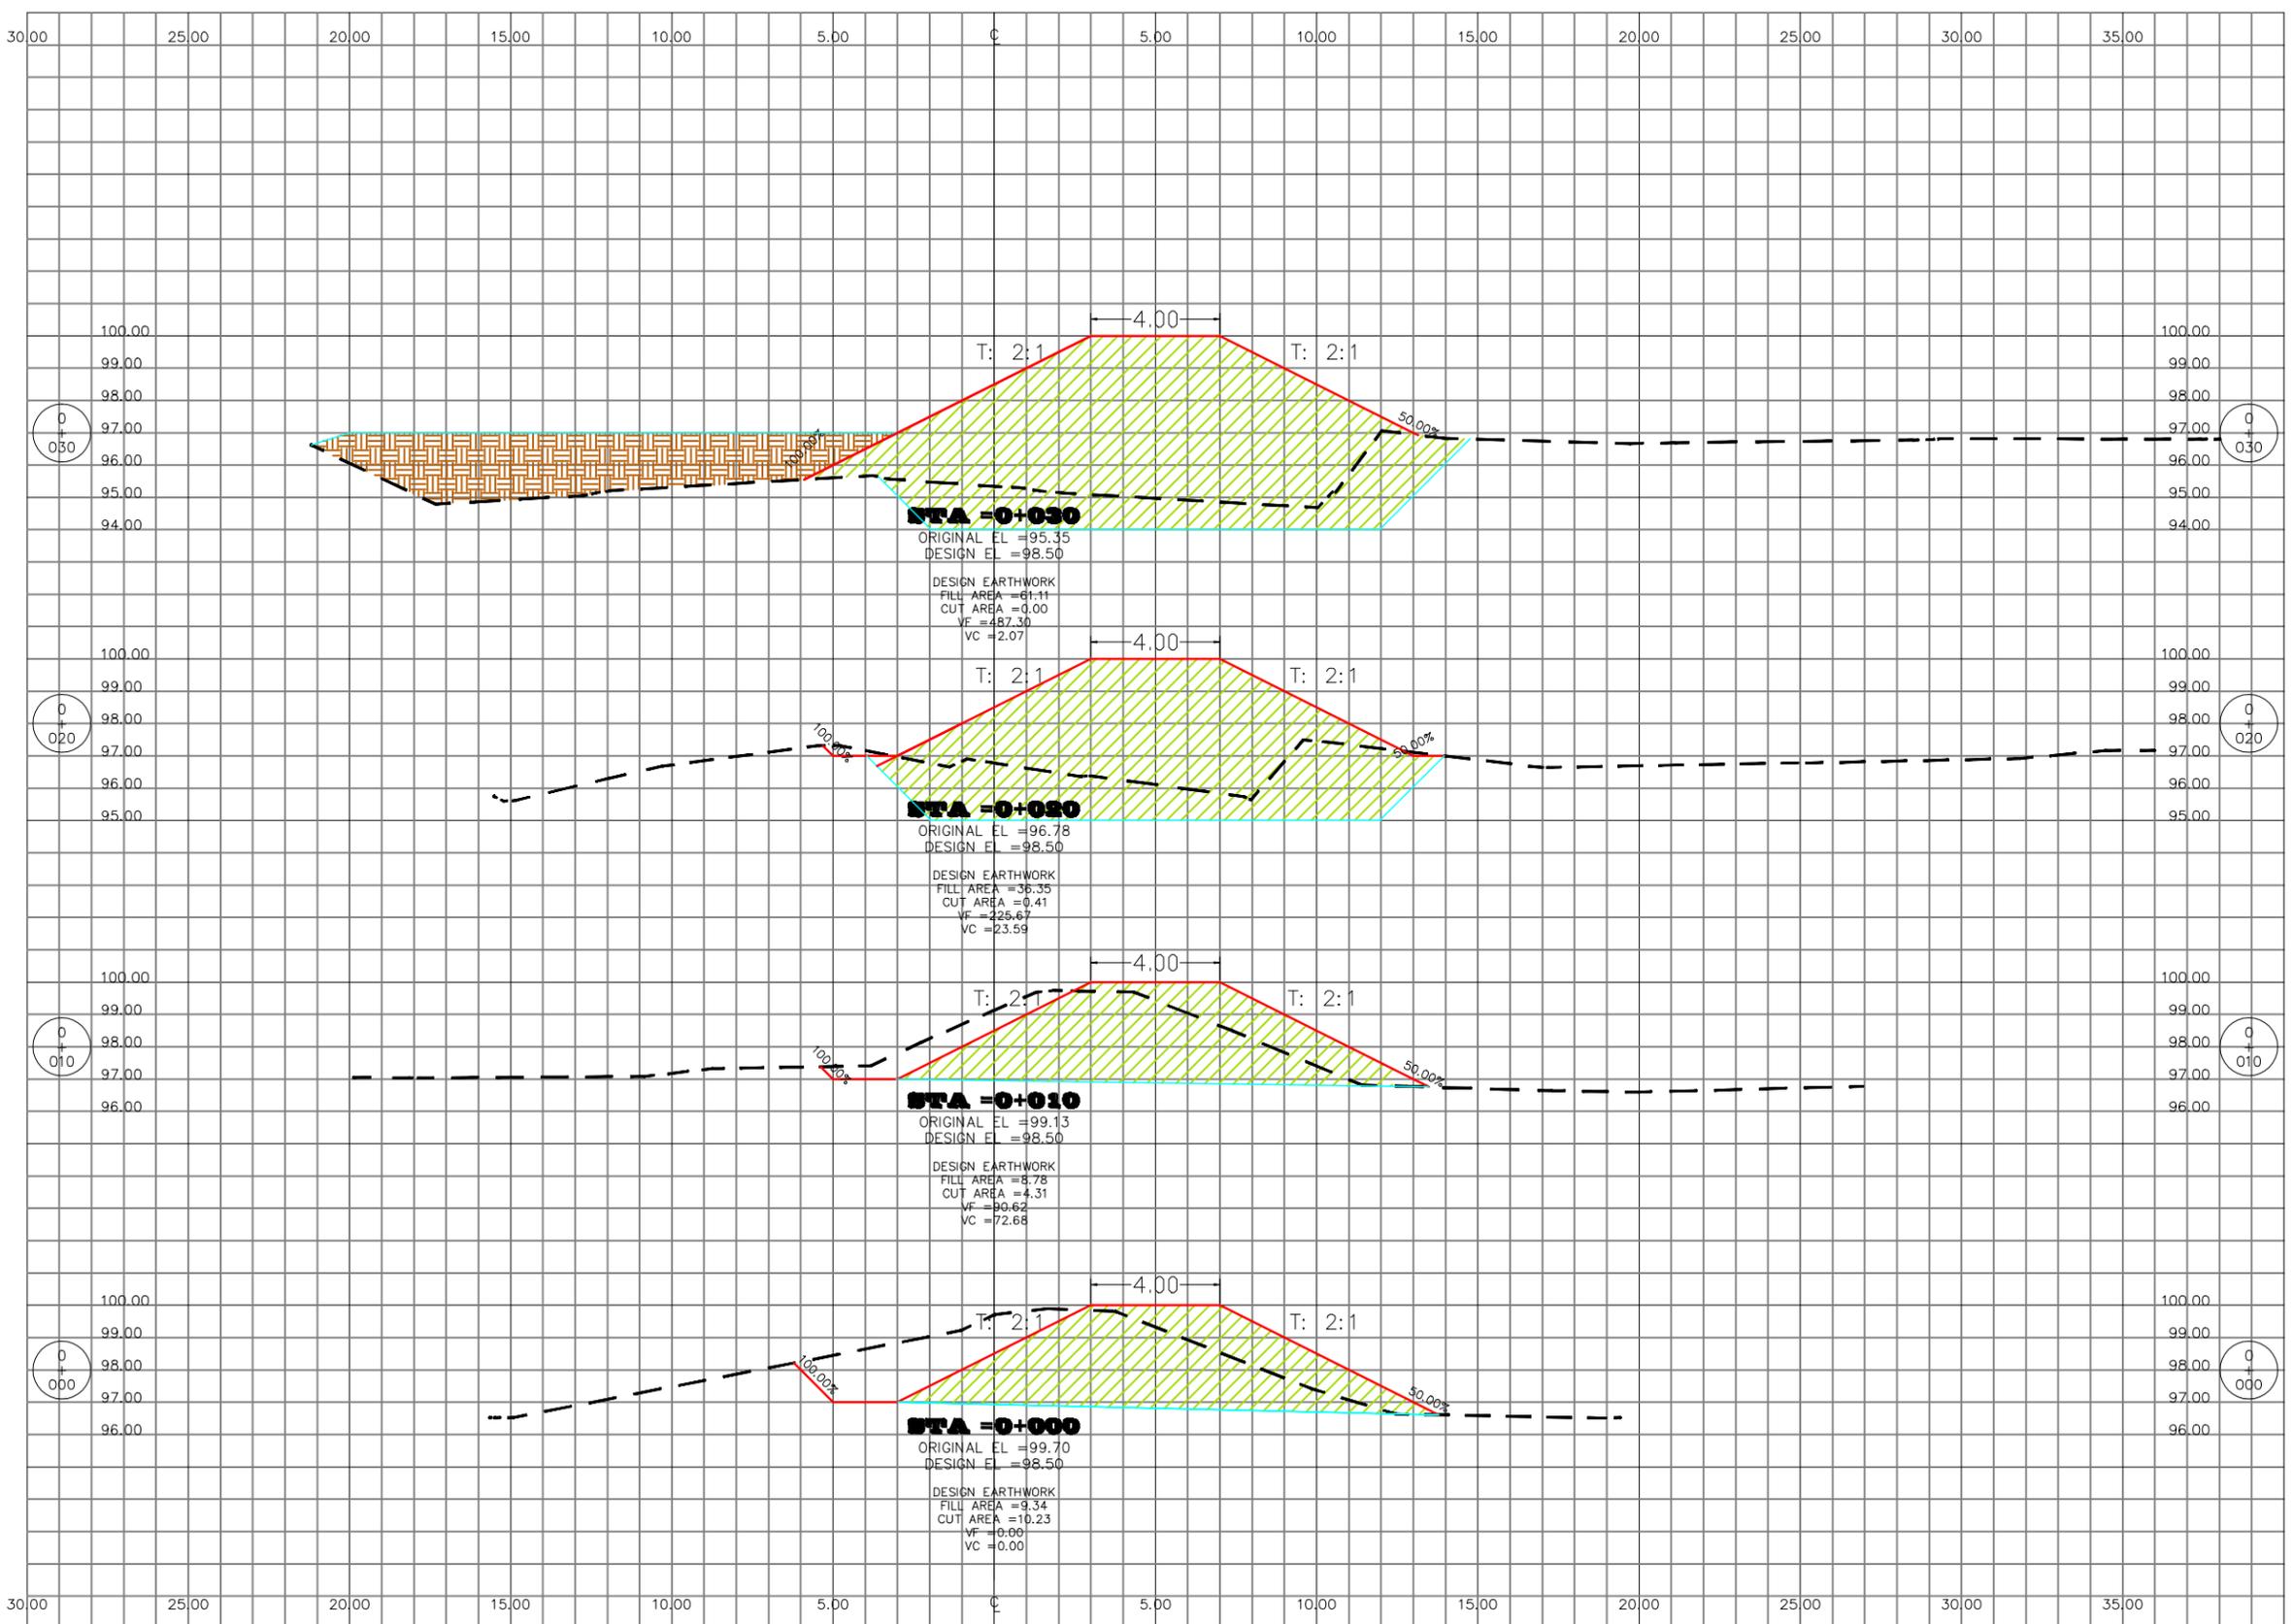

LEVANTO:  
 VICTOR CARRANZA  
 DISEÑO: CCIVS  
 DEPTO DE INGENIERIA  
 DIBUJO: CCIVS  
 DEPTO DE INGENIERIA  
 REVISÓ:  
 CCIVS  
 APROBÓ:  
 ING. NEIL PATRICK DIAZ  
 DEPTO. DE INGENIERIA  
 ING. SERGIO VILLATORO  
 CRUZ  
 DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
 RECONSTRUCCION  
 DE TRAMO DE  
 BORDO MARGEN  
 IZQUIERDA DE  
 RIO ULUA  
 SECTOR LA  
 DEMOCRACIA.  
 PROPIETARIO:  
 C.C.I.V.S.  
 UBICACIÓN:  
 JURISDICCION DE  
 SAN MANUEL  
 DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:  
**SECCIONES  
 TRANSVERSALES**  
 0+000 -0+030  
 ESCALA:  
 SE  
 FECHA:  
 DIC. 2020

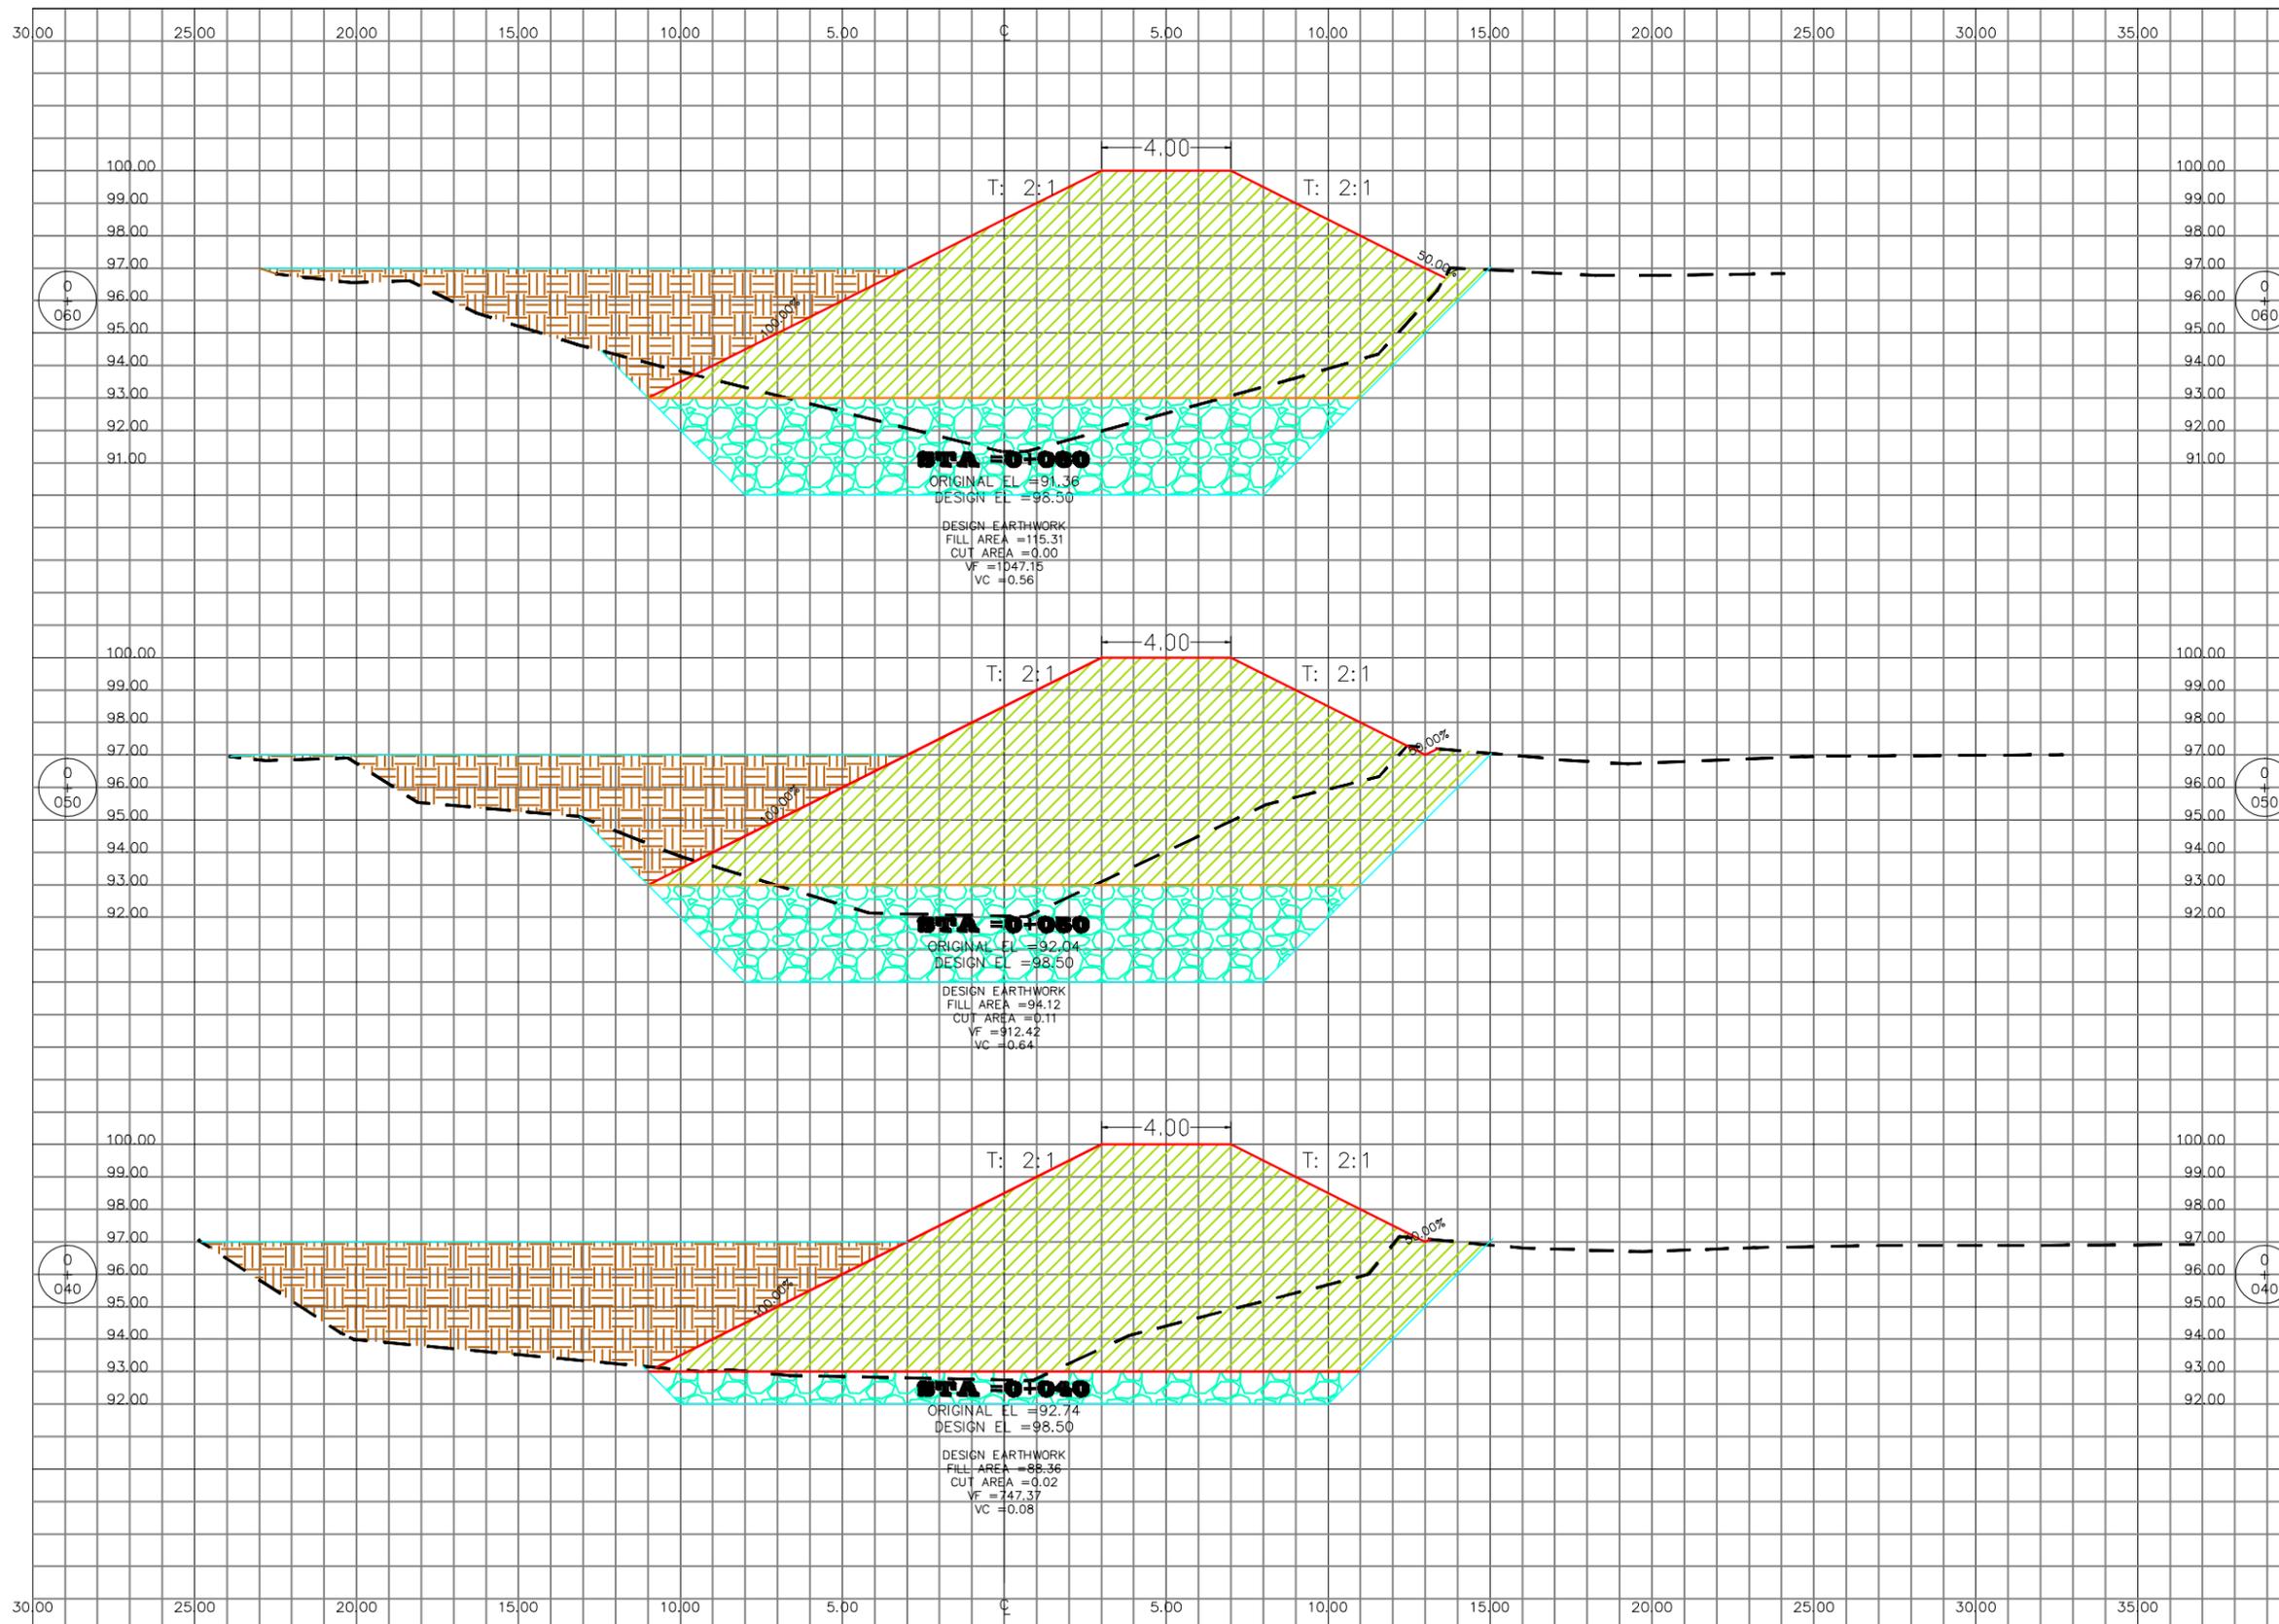

LEVANTO:  
 VICTOR CARRANZA  
 DISEÑO: CCIVS  
 DEPTO DE INGENIERIA  
 DIBUJO: CCIVS  
 DEPTO DE INGENIERIA

REVISÓ:  
 CCIVS

APROBÓ:  
 ING. NEIL PATRICK DIAZ  
 DEPTO. DE INGENIERIA  
 ING. SERGIO VILLATORO  
 CRUZ  
 DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
 RECONSTRUCCION  
 DE TRAMO DE  
 BORDO MARGEN  
 IZQUIERDA DE  
 RIO ULUA  
 SECTOR LA  
 DEMOCRACIA.

PROPIETARIO:  
 C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:  
 JURISDICCION DE  
 SAN MANUEL  
 DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:  
**SECCIONES  
 TRANSVERSALES**  
 0+040-0+060

ESCALA:  
 SE

FECHA:  
 DIC. 2020




**CCIVS**

LEVANTO:  
VICTOR CARRANZA  
DISEÑO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA  
DIBUJO: CCIVS  
DEPTO. DE INGENIERIA  
REVISÓ:  
CCIVS  
APROBÓ:  
ING. NEIL PATRICK DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
CRUZ  
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
RECONSTRUCCION  
DE TRAMO DE  
BORDO MARGEN  
IZQUIERDA DE  
RIO ULUA  
SECTOR LA  
DEMOCRACIA.  
PROPIETARIO:  
C.C.I.V.S.  
UBICACIÓN:  
JURISDICCION DE  
SAN MANUEL  
DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:  
**SECCIONES  
TRANSVERSALES**  
0+062.52-0+090  
ESCALA:  
SE  
FECHA:  
DIC. 2020

HOJA  
5 / 6

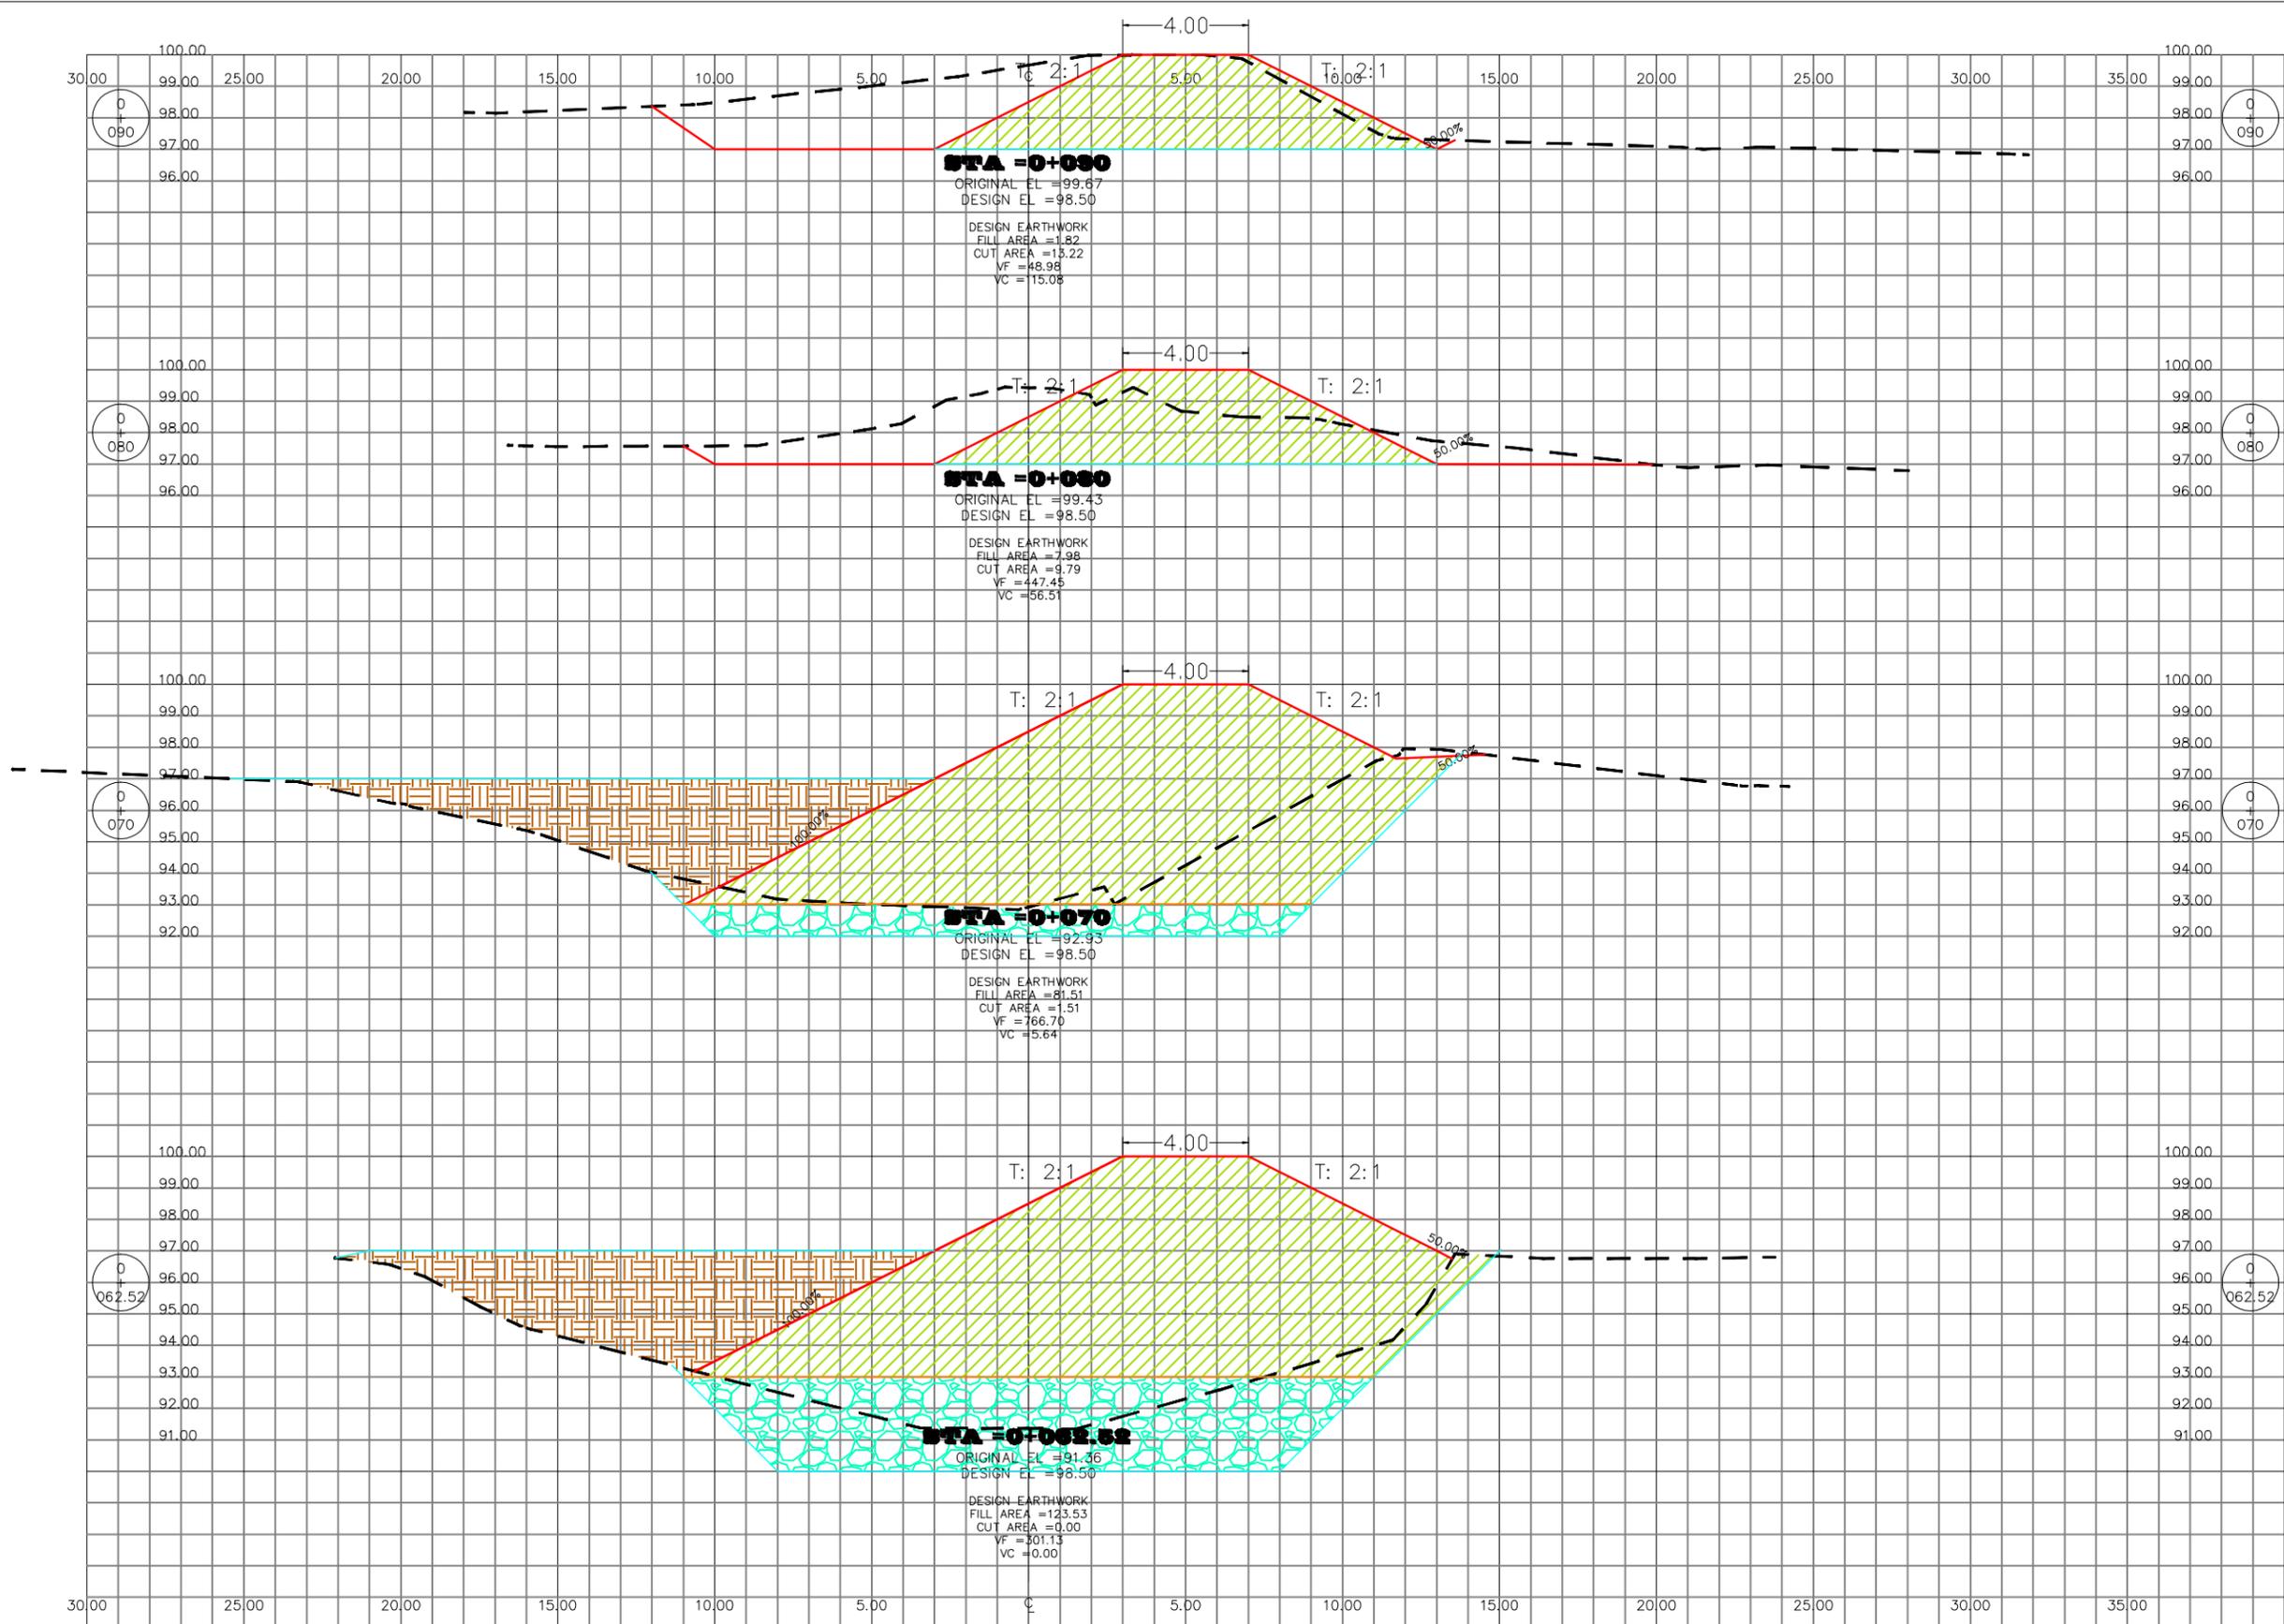



COMISION PARA EL CONTROL DE INGRESOS DEL VALLE DE SOLA  
**CCIVS**

LEVANTO:  
VICTOR CARRANZA  
DISEÑO: CCIVS  
DEPTO DE INGENIERIA  
DIBUJO: CCIVS  
DEPTO DE INGENIERIA

REVISÓ:  
CCIVS

APROBÓ:  
ING. NEIL PATRICK DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
CRUZ  
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
RECONSTRUCCION  
DE TRAMO DE  
BORDO MARGEN  
IZQUIERDA DE  
RIO ULUA  
SECTOR LA  
DEMOCRACIA.

PROPIETARIO:  
C.C.I.V.S.

UBICACIÓN:  
JURISDICCION DE  
SAN MANUEL  
DEPTO. DE CORTES

CONTENIDO:  
**SECCIONES  
TRANSVERSALES**


0+091.65

ESCALA:  
SE



FECHA:  
DIC. 2020

HOJA


6 / 6

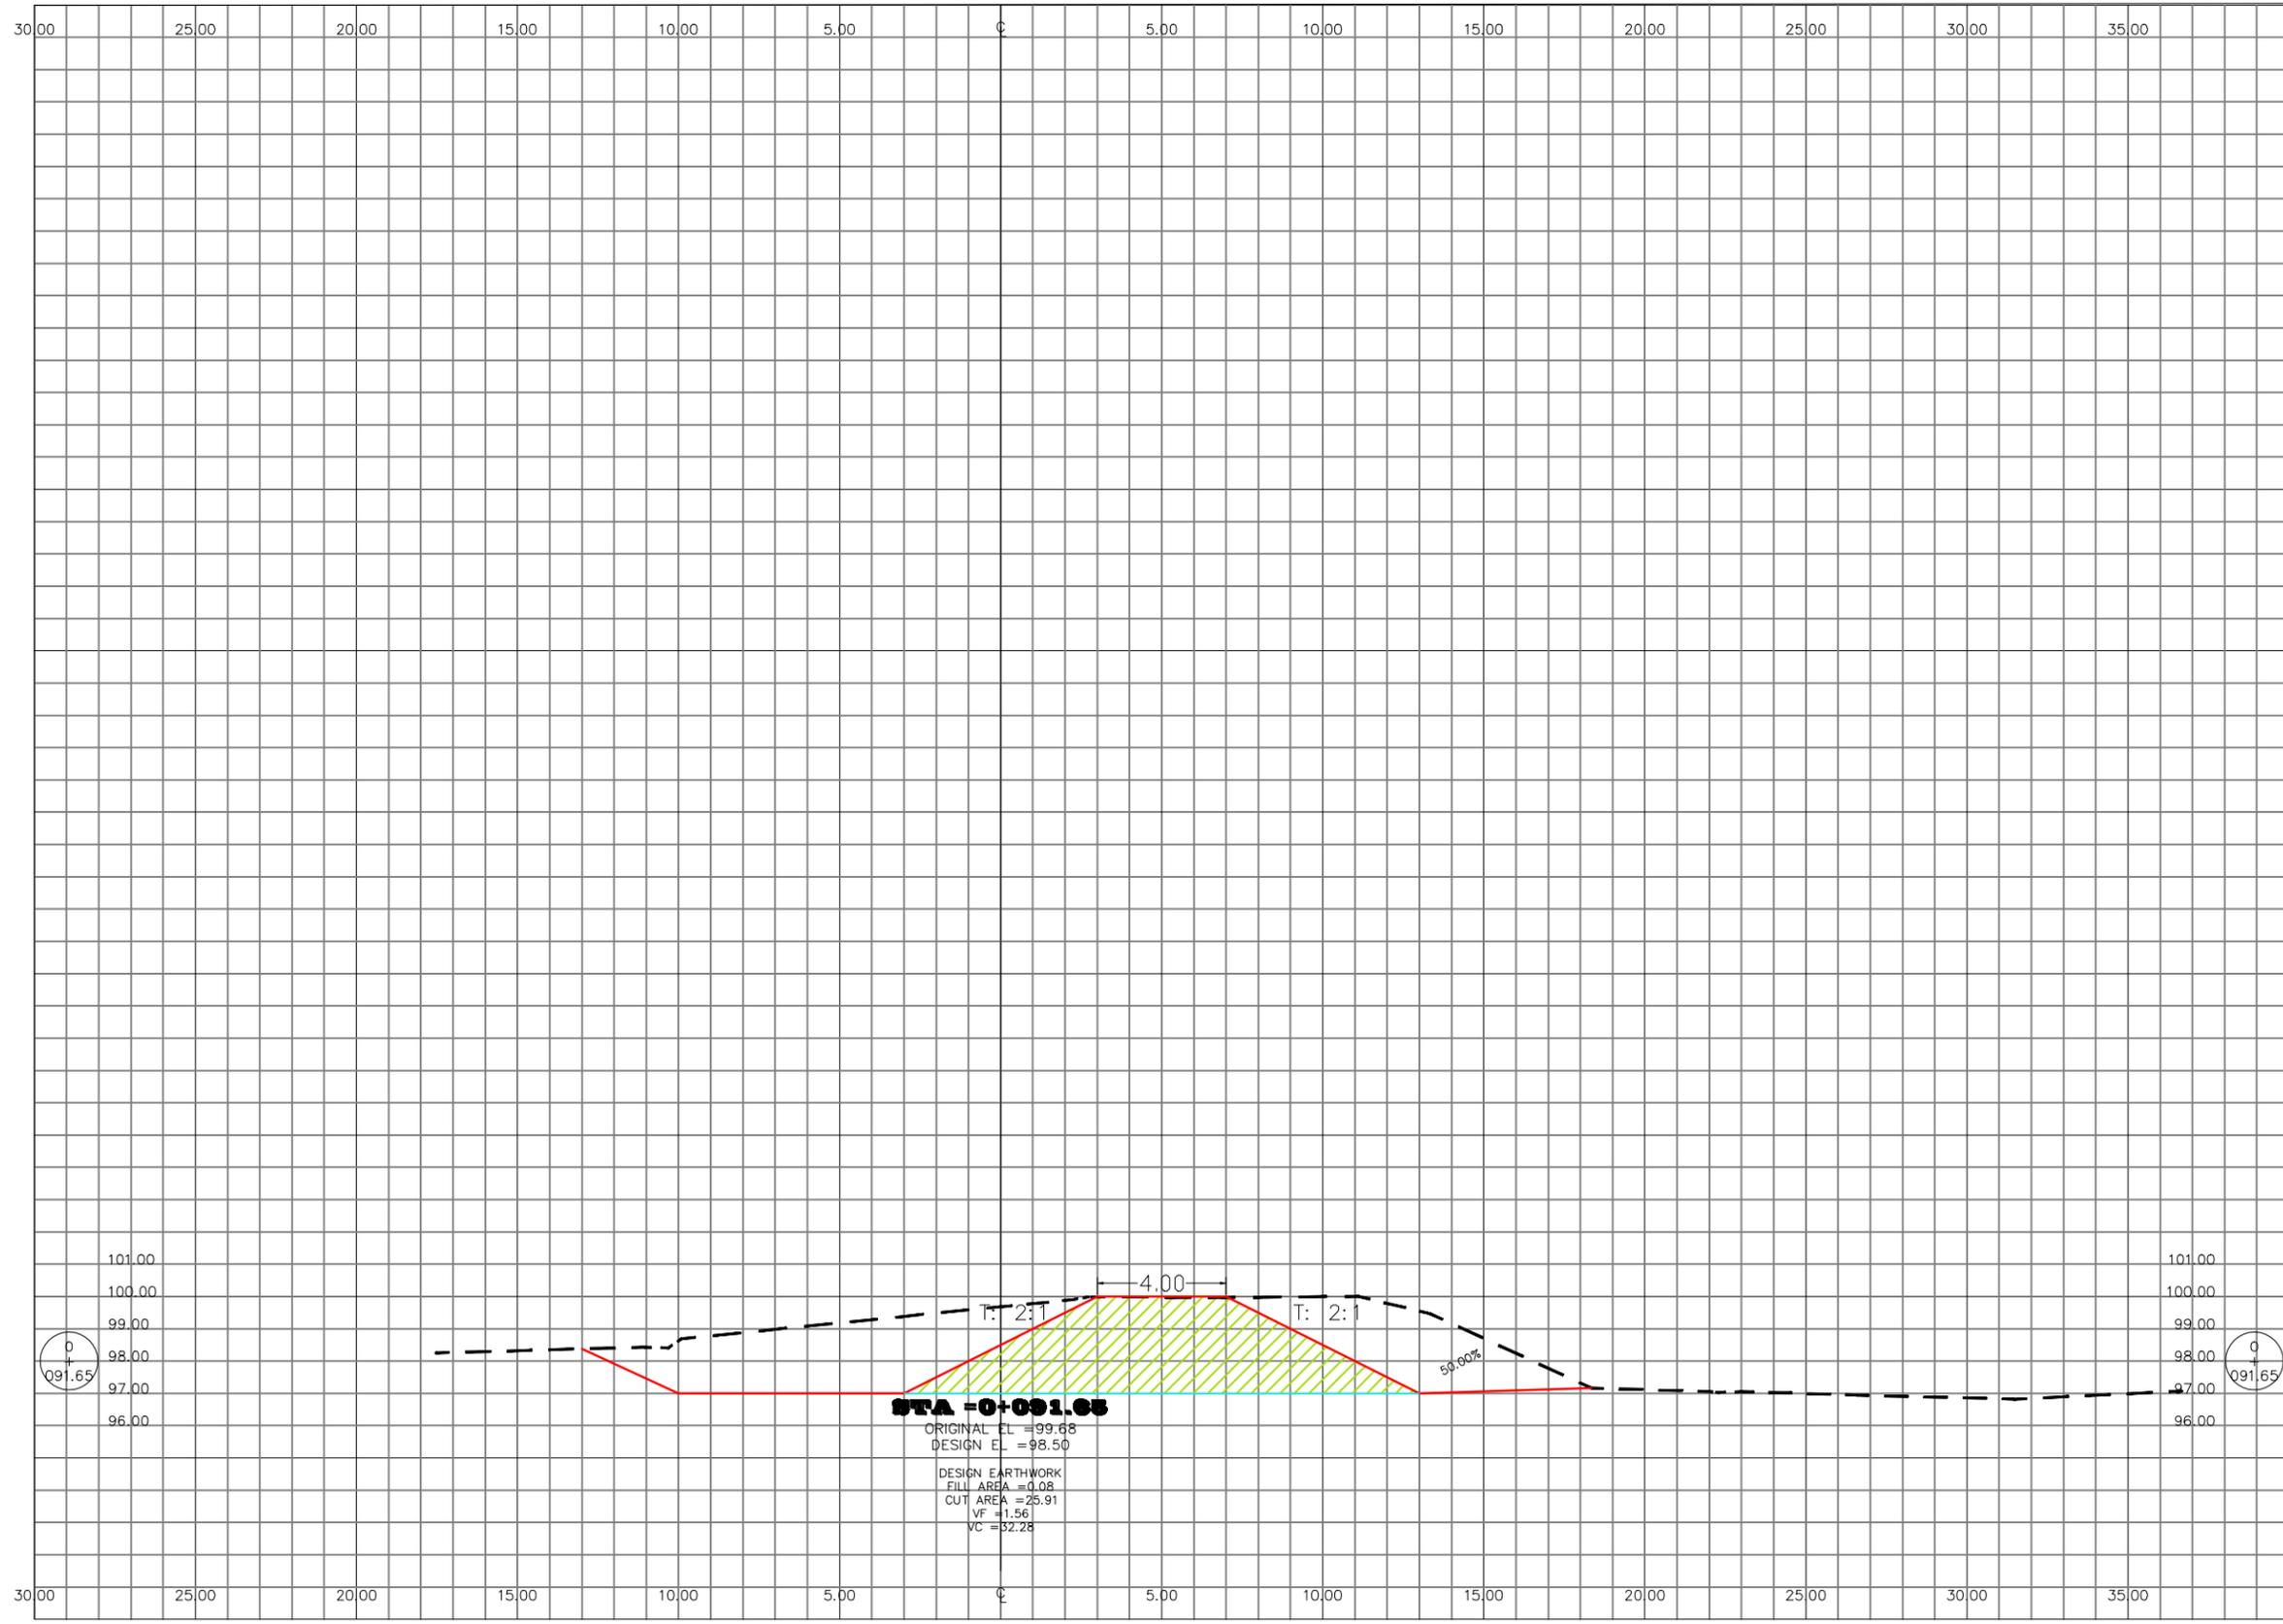

# SECCION TIPICA CENTRO PENAL PROGRESO YORO

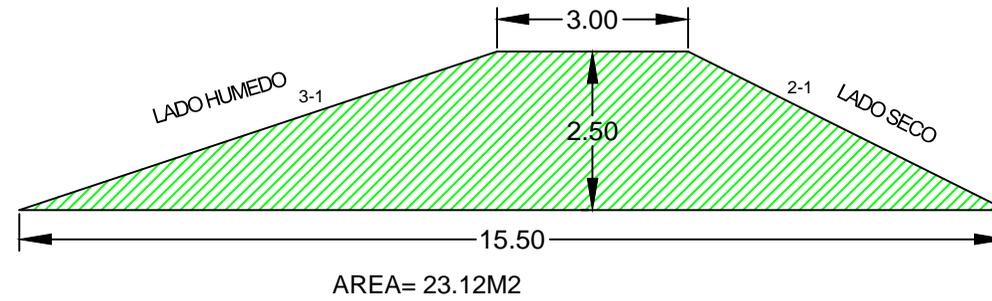

## SECCION TIPICA CANALIZACION

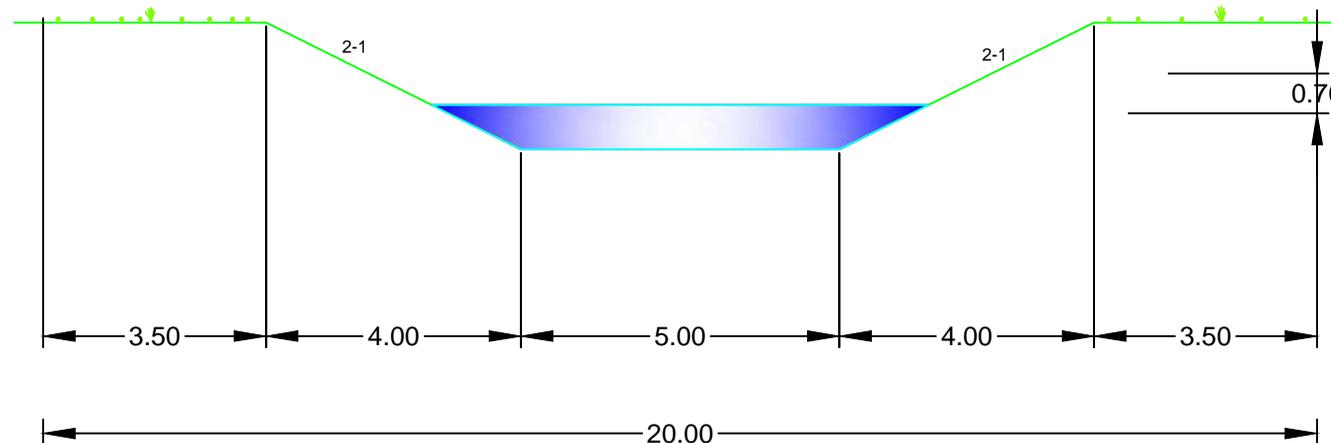

LEVANTO:  
CCIVS  
DISEÑO:  
CCIVS  
DIBUJO:  
CCIVS  
REVISÓ:  
CCIVS  
APROBÓ:  
ING. NEIL DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
DIRECTOR CCIVS

PROYECTO:  
RECONSTRUCCION DE BORDO M.D Y MEJORAMIENTO HIDRAULICO DE LA QUEBRADA LOS CASTAÑOS, SECTOR COL. NACIONAL EL PROGRESO YORO.

PROPIETARIO:  
C.C.I.V.S.  
UBICACION:  
-  
PROGRESO YORO


CONTENIDO:  
SECCIONES TIPICAS

ESCALA:  
SE  
FECHA:  
DICIEMBRE 2020

HOJA  
1 / 1

# SECTORES CAMPO BUENA VISTA Y CAMPO LAS FLORES


## UBICACION

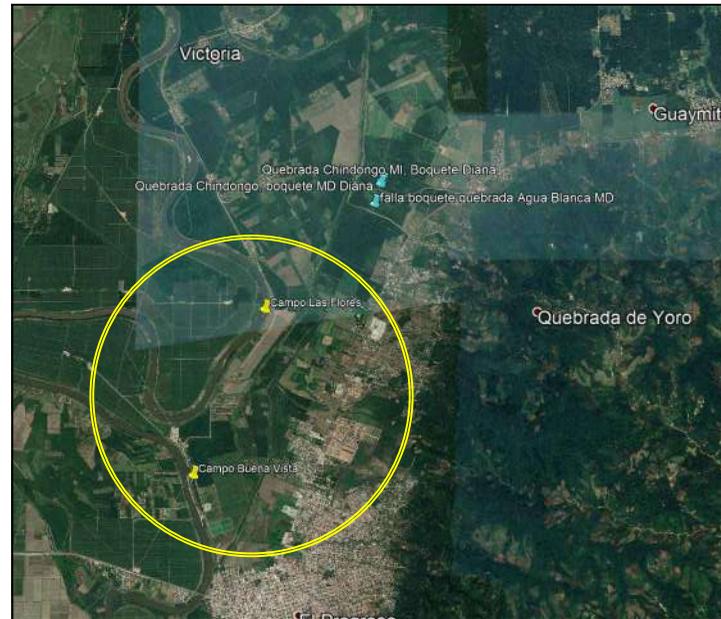

CAMPO BUENA VISTA



CAMPO LAS FLORES

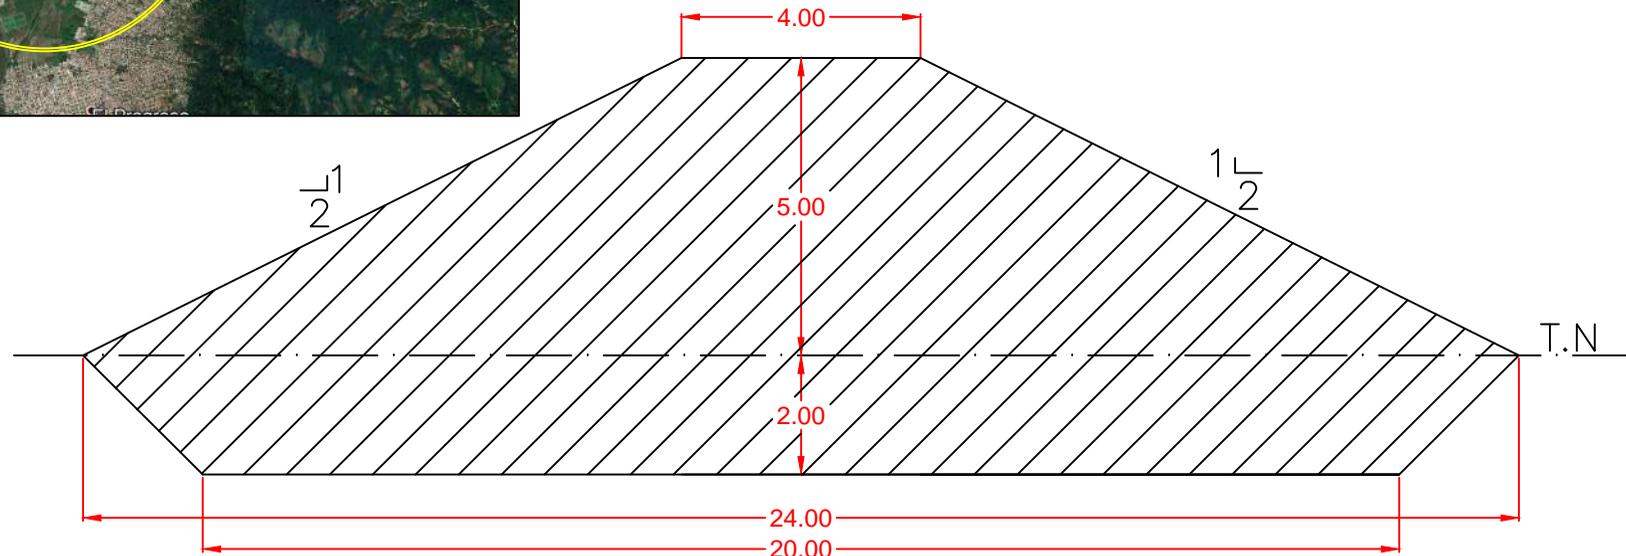

AREA DE SECCION DE BORDO: 114.00M2



LEVANTO:  
CCVS  
DISEÑO:  
CCVS  
DIBUJO:  
CCVS

REVISÓ:  
CCVS

APROBÓ:  
ING. NEIL DIAZ  
DEPTO. DE INGENIERIA  
ING. SERGIO VILLATORO  
DIRECTOR CCVS

PROYECTO:  
CIERRE PROVISIONAL DE  
TRAMOS DE BORDO  
MARGEN DERECHA DEL  
RIO LULUA, SECTORES  
CAMPO BUENA VISTA Y  
CAMPO LAS FLORES.

PROPIETARIO:  
C.C.I.V.S.

UBICACION:  
JURISDICCION DE EL PROGRESO  
DEPTO. DE YORO

CONTENIDO:  
SECCIONES  
TIPICAS

ESCALA:  
SE

FECHA:  
DICIEMBRE 2020

HOJA

1 / 1
